

分类号_____

密级_____

UDC _____

编号_____

中南大學

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

硕士学位论文

论文题目 铜官窑国家考古遗址公园

建设项目可行性研究

学科、专业 工商管理

研究生姓名 骆志平

导师姓名及
专业技术职务 张颖 教授

2011年5月

原创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名： 骆志平 日期： 2011 年 5 月 25 日

学位论文版权使用授权书

本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。

作者签名： 骆志平 导师签名： 沈钢 日期： 2011 年 5 月 25 日

摘 要

文化遗产是中华文明史的历史见证，也是几千年文明史的重要载体。它们集中代表了中华民族传统文化的丰富内涵和发展的历史轨迹，具有不可替代的整体价值和地位，千年古窑——长沙铜官窑即是其中之一。随着社会的变迁，尤其是当代工业化和城市化进程的加快，同世界上众多的古文化遗址一样，长沙铜官窑遗址正面临着被现代工业的快速发展破坏的威胁。因此在现有长沙铜官窑遗址基础上，将长沙铜官窑遗址区规划为集文物保护、教育、科研、旅游、休闲等多种功能于一体的“长沙铜官窑国家考古遗址公园”，显得十分必要。

本文以国内外可行性研究的发展为理论指导，运用定量分析与定性分析、理论结合实践的方法，结合项目的具体特征，对铜官窑国家考古遗址公园建设工程的可行性进行了深入系统的研究。文章从建设与编制单位、原则、厂址选择等方面概况了铜官窑遗址项目的基本情况、特点。重点从考古遗址保护、文化遗产展示、工程建设、组织结构及劳动定员和实施进度及招标方案五个部分详细分析了铜官窑遗址工程项目方案的制定。对项目的投资建设投资、总投资和铺底流动资金进行估算，分析资金筹措方式、成本和自筹资金的来源。最后对项目财务效益及社会评价进行了深度分析，包括财务测算、财务效益评价、社会效益评价和风险分析，并提出了相应的防范措施。文章结构清晰、层次分明，论证充分透彻，项目的研究得出了较强的实施可行性的结论。

关键词 铜官窑，可行性研究，项目方案

ABSTRACT

Cultural heritage is the testimony and important carrier of thousands of years in China's civilization history. They represents the abundant traditional culture and development history of Chinese nation, which has irreplaceable overall value and position, the millennium ancient kiln —Changsha Tong GuanYao is one of them. Along with the change of society, especially modern industrialization and the acceleration of urbanization, the same as many sites in the world, Tong GuanYao sites are facing with the threat and destruction from the rapid development of modern industrial. Therefore based on the existing Changsha Tong GuanYao sites area ,we are planning to building the " Changsha Tong GuanYao national archaeological site park"including cultural relics, education, scientific research, travel, leisure and other functions,it appears very necessary.

Based on the development of domestic and foreign feasibility study for theoretical guidance, by using quantitative and qualitative analysis, integrating theory and practice method , in combination with the specific characteristics of the project, We deeply and systematically do reasearch on the construction project feasibility study of of Tong GuanYao national park. This article introuduces the basic situation, characteristics of projec from the construction and compilation unit, principle, the site selection of Tong GuanYao. Emphasis on analysis the Tong GuanYao project plan from five parts: the archaeological site protection, cultural heritage demonstrated, engineering construction, organization structure and labor over-staff and implementation schedule and the bidding scheme. The project investment and construction investment, total

investment and the current funds, cost and funds self-raised funds resources are also calculated and analyzed. Finally we carried out in-depth analysis on project financial benefit and social evaluation, including financial estimates, benefit evaluation, social benefit evaluation and risk analysis, and put forward corresponding preventive measures. The paper have a clear, distinct structure and the project is also feasibility .

KEY WORDS Tong GuanYao project, feasibility study, project schemes

目 录

第1章 导论 1

1.1 选题背景 1

1.2 国内外研究综述 2

1.2.1 国外研究综述 2

1.2.2 国内研究综述 3

1.3 研究内容 4

1.4 研究的主要方法 5

第2章 项目概况及特点 6

2.1 项目概况及特点 6

2.1.1 建设内容 6

2.1.2 建设与编制单位 6

2.1.3 编制原则及范围 7

2.1.4 场址选择及建设条件 7

2.2 工程建设的必要性 9

第3章 市场分析预测及建设规模 12

3.1 市场分析与预测 12

3.1.1 遗址景观旅游市场发展现状 12

3.1.2 市场定位和客源市场分析 12

3.1.3 重点客源市场人口规模 13

3.1.4 游客规模预测 13

3.1.5 环境容量测算 14

3.2 建设规模的确定 14

第4章 项目方案的制定 16

4.1 考古遗址保护方案 16

4.1.1 长沙铜官窑遗址目前发现状况 16

4.1.2 遗址本体保护方案 16

4.2 文化遗产展示方案 18

4.2.1 考古过程展示 18

4.2.2 文化遗产遗址展示方案 18

4.3 工程建设方案 20

5

4.3.1 建筑	20
4.3.2 道路	21
4.3.3 给水排水	23
4.3.4 电气	25
4.4 组织机构及劳动定员方案	27
4.4.1 组织机构	27
4.4.2 劳动定员	28
4.4.3 人员培训	28
4.5 项目实施进度及招标方案	29
4.5.1 项目实施进度计划	29
4.5.2 工程招投标方案	30
第5章 投资估算及资金筹措	33
5.1 投资估算	33
5.1.1 投资估算依据	33
5.1.2 项目建设投资估算	33
5.1.3 铺底流动资金	35
5.1.4 项目总投资与投入总资金	35
5.2 资金筹措	35
5.2.1 资金筹措方式	35
5.2.2 自筹资金来源分析	35
第6章 效益评价及风险分析	37
6.1 财务效益评价	37
6.1.1 财务评价依据	37
6.1.2 财务评价的结论	37
6.2 社会效益评价	38
6.2.1 国民经济的带动效益	38
6.2.2 对当地居民收入的影响	40
6.2.3 对就业的影响	41
6.2.4 对相关利益群体的影响	41
6.2.5 对所在地文化教育卫生等方面的影响	42
6.2.6 项目与社会的互适性分析	42
6.3 风险分析	44
6.3.1 项目风险因素识别	44

6.3.2 项目风险评估 44

6.3.3 防范风险的对策 46

结 论 47

参考文献 48

致 谢 51

5

第 1 章 导论

1.1 选题背景

文化遗产是中华文明史的历史见证，也是几千年文明史的重要载体。它们集中代表了中华民族传统文化的丰富内涵和发展的历史轨迹，具有不可替代的整体价值和地位，千年古窑——长沙铜官窑即是其中之一。

随着社会的变迁，尤其是当代工业化和城市化进程的加快，同世界上众多的古文化遗址一样，长沙铜官窑遗址正面临着被现代工业的快速发展破坏的威胁。较之于国外文物遗址多为石结构易于保存和保护的特点，长沙铜官窑遗址为土遗址，其破坏严重、保护难度较大，保护迫在眉睫；同时，就长沙铜官窑遗址本身来说，其遗址面积大、埋藏浅，且大部分遗存埋藏在民居、道路和农田之下，现代建筑所造成的挤压和居民的耕作、取土行为等严重破坏了遗址的原始地面，扰动了遗址的文化堆积层，遗址区内的挖泥洞大部分坍塌，目前保存完整的只有为数很少的几个，也濒临塌毁，急待抢救。

长沙铜官窑遗址位于湖南省长沙市望城县丁字镇彩陶源村，距长沙市约 27km。长沙铜官窑遗址发现于上世纪五十年代，先后经历了四次考古发掘，出土文物逾万件。长沙铜官窑遗址是唐至五代时期的重要制瓷遗址，属于全国第三批重点文物保护单位、全国 100 个重要大遗址保护项目，其保护利用受到国家文物局、省、市领导的高度重视和关注。长沙铜官窑作为世界釉下多彩陶瓷的发源地，在有着 3000 余年悠久历史文化的长沙市，是极具价值和代表性的历史文化遗产之一，在长沙文化强市战略的旅游大格局中独具魅力。

为了寻求最好的保护方案，并充分挖掘好长沙铜官窑遗址的经济价值，推动地域经济和社会的发展，依据“重科学、重投入、重持续、重民生”的大遗址保护模式，以保护和展示遗址本体及其内涵和价值为根本目的，在现有长沙铜官窑遗址基础上，综合考虑其人文环境、自然环境的保护、展示和利用，将长沙铜官窑遗址区集中体现文物价值的保护区（约 2km²）规划为集文物保护、教育、科研、旅游、休闲等多种功能于一体的“长沙铜官窑国家考古遗址公园”，显得十分必要。

1.2 国内外研究综述

可行性研究(Feasibility Study)是指在投资决策之前,对拟建项目进行全面的技术经济分析论证并试图对其可行或不可行评价的一种科学方法,它是投资前期工作的重要内容,是投资建设程序的重要环节,是项目的投资决策中必不可少的一个工作程序。在投资项目管理中,可行性研究是指在项目投资决策之前,调查、研究与拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等因素,在此基础上分析投资建设方案,预测、评价项目建成后的社会经济效益,并在此基础上,综合论证项目投资建设的必要性、财务上的盈利性、经济上的合理性、技术上的先进性等,从而为投资决策提供科学依据。

1.2.1 国外研究综述

美国是最早开始采用可行性研究方法的国家。在19世纪至20世纪50年代中期,国外对项目进行投资决策前,主要是通过对项目的收入和支出进行比较来判断项目的优劣,其本质就是简单的财务评价。但随着社会的发展,简单的财务评价已不能满足社会、政府和企业对项目投资决策的多元化需求。20世纪50年代至70年代间的西方国家大多采用企业财务分析和效益分析,来对项目的投资可行性进行分析。在20世纪70年代,可行性研究得到了进一步的发展,联合国工业发展组织(1972)委托P·达斯普塔和S·玛尔果林等编写了《项目评价准则》,在该书中,他们以联合国工业发展组织命名,提出了UNIDO法(传统法),为可行性研究的研究和发展奠定了基础。80年代以来,可行性研究理论逐步向各种专业领域渗透,与各专业进行理论交叉和融合。根据专业差别,可行性研究理论在基础理论、方法论和应用方面得到了广泛的探讨。许多研究者详细分析了项目投资的不确定性和风险,完善了可行性研究理论,其中比较有影响力的有George Wu&Richard Gonzalez(1999),B·Mulholland&J·Christian(1999),Robert T·Cheme & Terence Reilly(1999),Dele Cooper&Chris Chapman(1987)等^[1]。另外,还有一些研究者对投资项目的经济评价做了深入的研究,其代表作有James E Smith(1994),Graig R. Fox&Amos Trersky(1998)等^[2]。此外,在预测方面,可行性理论也得到了深入的发展,如Spyros Makridaks和Steven C. Wheelwright出版了《预测方法及应用》,科学地论述了预测的相关方法及其优缺点,同时对其应用给出了指导;^[3]日本住宅新报社出版了《住宅投资的长期预测》用较科学的预测方法分析了商品住宅在21世纪的需求预测量。在项目投资决策分析方法方面,除了传统的纯经济效益的静态评价法和动态评价法之外,又发展了实物期权法(Real Options法)(Myer, 1977)和可用于多目标评价决

策的层次分析法（AHP 法）（T.L.Saaty, 1980）等^[4]。同时，许多国外研究者将可行性分析运用到了各专业领域，如美国 1999 年出版了《REIT 不动产投资信托实务》，日本评论社出版了《公共项目投资的经济效果》、《公益事业的投资评价与展望》等^[5]。各国在项目投资领域中对预测、风险、评价等方面进行了较有成效的研究，这些丰硕的成果为可行性研究发展提供了理论基础和应用案例。

1.2.2 国内研究综述

在可行性研究理论发展的国际大环境下，我国的可行性研究理论也随着我国经济和社会的升华而得以完善。1952 年，我国财政委员会颁发了《基本建设工作暂行管理办法》，这是建国以来第一个关于基本建设程序和管理文件。该文件规定，基本建设程序划分为计划任务书、初步设计、组织施工、竣工验收四个阶段，当时的技术经济分析都是决策后期的工作，设计任务书作为工程项目的决策依据。此后的 20 多年，我国主要沿用苏联的技术经济论证方法来进行项目的可行性分析。进入 21 世纪以后，中国国家计划委员会在 2001 年 9 月委托中国国际工程咨询公司编写《投资项目可行性研究指南》。^[6]该指南总结了我国自改革开放以来可行性研究工作的经验教训，是一本指导可行性研究工作方法及内容的纲领性文件，为我国新世纪各类投资项目的可行性研究指明了方向。为了进一步贯彻落实《投资项目可行性研究指南》的各项内容，《投资项目可行性研究指南》的主编于守法先生和国内部分专家又共同编著了《投资项目可行性研究方法与应用手册》一书，在该书中，作者系统地介绍了可行性研究与经济评价工作的基本理论、具体业务内容和方法，并编入了大量不同类型项目的可行性研究和项目评估案例，集理论、方法与操作案例于一体，是一部全面系统的投资项目决策工作业务指导书。^[7]

国内学者在可行性研究方面也成果丰硕。比较有代表性的作品有：于守法（2002）编写的《投资项目可行性研究方法与应用手册》系统地介绍了可行性研究与经济评价工作的基本理论、具体业务内容和方法，并编入了大量不同类型项目的可行性研究和项目评估案例，集理论、方法与操作案例于一体，是一部全面系统的投资项目决策工作业务指导书；王武龙（2000）编写的《投资项目经济咨询评估指南》包括评估方法、附录和案例三大部分，对有关评估方法涉及到的有关方法和具体操作规范、国内外有关评估方法的最新知识、学术动态、观点进行了系统介绍，并对内外投资成本、费用、价格；^[8]游达明（2001）在《技术经济与项目经济评价》一书中系统、简练地介绍了经济效果评价方法、项目的财务评价、国民经济评价、不确定性与风险分析等；^[9]赵国杰（2003）编写的《投资项目可行性研究》在阐释可行性研究基本原理、基本构架、基本方

法之外,把战略、战略分析纳入可行性研究体系之中,把海外投资可行性研究,非凡是海外投资战略选择、国家风险评估纳入可行性研究体系之中,涉及技术分析而突出财务评价、经济评价、社会评价、环境评价;^[10]吴瑶枢(2009)在《建设项目可行性研究报告编制析论》一书中认为建设项目可行性研究报告是项目审批立项、领导决策的重要依据,但在实践中编制可行性研究报告还存在着报告结构不全、深度不够、经济分析数据不实等诸多问题,建议在谨遵行业标准、摆正因果关系,落实资源、科学选择厂址和工程技术方案、严格节能措施、明确投资估算和资金筹措渠道、强调风险分析等几个方面逐步提高编制水平;^[11]梁爽(2001)在《房地产投资可行性分析中的成本及投资估算》中,分析了房地产开发成本的构成,并提出了房地产投资成本的估算原理和方法等等。^[12]另外,唐建(2008)认为可行性研究是项目建设的重要依据,可行性研究的可靠性、准确性,决定了投资决策和项目建设的成败。^[13]邹坦,郭春翔(2008)通过分析我国工程项目投资决策可行性研究的重要性,就如何做好投资决策可行性研究提出了对策建议,认为农村可行性报告的要求是客观、全面、真实、科学与公正^[14]。何全君(2008)认为随着我国建设市场的快速发展,以及招标投标制度、合同制度、工程量清单制度的广泛推行,项目投资方已逐步意识到加强建设成本全过程控制的重要性。文章从合同、组织、技术、信息等方面,探讨了建设工程项目管理中关于成本控制的几点有效途径等等。^[15]

1.3 研究内容

本文从以下6个部分进行可行性研究:

第1章介绍本项目的研究背景,综述了国内外可行性研究的相关理论,介绍了铜官窑国家考古遗址公园建设工程的可行性研究的内容和研究的方法。

第2章从建设与编制单位、原则、厂址选择等方面概况了铜官窑遗址项目的基本情况、特点,从四个方面说明了此次工程建设的必要性。

第3章对铜官窑遗址工程进行了市场分析和预测,把项目的客源市场分为基础市场、重点市场、机会市场和专业市场。测算了游客规模和环境容量。

第4章从考古遗址保护、文化遗产展示、工程建设、组织结构及劳动定员和实施进度及招标方案五个部分详细分析了铜官窑遗址工程项目方案的制定。

第5章对项目的投资建设投资、总投资和铺底流动资金进行估算,分析资金筹措方式、成本和自筹资金的来源。

第6章对项目财务效益及社会评价进行了深度分析,包括财务测算、效益

评价、社会效益评价和风险分析，并提出了相应的防范措施。

1.4 研究的主要方法

本文拟采取下列研究方法。

- (1) 定量分析与定性分析相结合。
- (2) 专家研讨法，以保证研究分析的充分性和全面性。
- (3) 理论与实践相结合。在进行实地市场调研的基础上，结合可行性分析的理论，保证了研究方法的科学性。

第 2 章 项目概况及特点

2.1 项目概况及特点

长沙铜官窑国家考古遗址公园建设工程的建设单位是湖南长沙铜官窑建设开发有限公司，建设地点湖南省长沙市望城县丁字镇，该项目是国家级重点文物保护单位建设工程。

2.1.1 建设内容

长沙铜官窑国家考古遗址公园以保护不动为原则，在原址上扩建公园。其具体项目包括：重要遗址展示、湘江风光带景观改造、长沙窑大道景观改造、景区道路工程、民居改造、水利水系改造、旅游配套设施等。

2.1.2 建设与编制单位

铜官窑项目的建设单位为湖南长沙铜官窑建设开发有限公司，它成立于 2009 年 9 月 8 日，公司注册资金 2000 万元人民币，公司类型为国有独资有限责任公司。公司经营范围为：在授权范围内经营管理国有资产资源、国有土地储备及房地产开发、经营，开展融资，开发商贸旅游，投资村庄开发、道路及园林绿化工程等基础设施建设。公司在董事长领导下开展工作，主要负责长沙铜官窑遗址的整体开发、招商、运营和统一管理。

公司的宗旨是依托长沙铜官窑文物资源优势、区位优势、便捷的水陆交通、优美的自然环境等有利条件，挖掘长沙铜官窑的文物资源、自然资源、人文资源、旅游资源，整体宣传长沙铜官窑的独特形象，全方位、多元化开发、经营、管理各有关文物保护项目和旅游项目，同时致力于长沙铜官窑文物资源的保护与研究，最终创建一个具有高品位自然景观和人文景观，集文物保护和休闲、度假、旅游于一体的旅游胜地。

公司的建设开发工作遵循“发掘文物资源优势，打造特色旅游名村”的发展思路，始终坚持高起点规划，精品化建设，大手笔运作。以国际化的视野，多角度、宽领域、有深度地分析长沙铜官窑旅游资源特色、文化内涵、比较优势，对旅游市场科学定位，对旅游项目空间布局进行科学的策划和规划，突出市场开发策略、旅游产品结构升级和调整、文物资源的开发与保护、建设开发高效监管。公司坚持“团结、求实、创新、高效”的企业经营理念，制定了完善的现代

化企业管理制度和高效激励的分配机制,建设创新精干的员工队伍,吸纳、引进高端管理和专业人才参与长沙铜官窑的开发建设。

项目的编制单位是湖南省国际工程咨询中心,该公司的资质等级为甲级,国家发展和改革委员会颁发了资质证书,编号是工咨甲 12220070018

2.1.3 编制原则及范围

铜官窑遗址建设的编制原则有六点,分别是:第一,坚持贯彻《中华人民共和国文物保护法》确定的“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针;第二,依照《世界自然和文化遗产公约》等相关国际文件,真实、完整的保存并延续长沙铜官窑文物遗存及其相关环境所包含的全部历史信息;第三,科学、合理、有效地制定保护、管理及环境整治措施,为遗存的永续存在、研究和利益提供保证;第四,在有效保护遗存的前提下,适当地向公众展示文物遗迹,促进旅游发展;第五,在核心保护区实施的保护工程,要充分注意遗址本体保护的最小干预、可逆性、可识别性、保护的全面性、有效性;第六,长沙铜官窑遗址的保护要与遗址所处的行政区域内的国民经济、社会发展规划、城乡建设发展规划、生态保护、环境整治、土地利用等各类专门性规划相衔接。编制范围包括长沙铜官窑遗址集中体现文物价值的保护区约 2km² 内的遗址保护、展示,道路、水、电、环境整治工程等基础设施建设。

2.1.4 场址选择及建设条件

长沙市位于湖南省东部偏北,处于湘江下游和长浏盆地西缘,东经 110°53'~114°15',北纬 27°51'~28°04'之间,五岭南屏,洞庭北扼。根据 2008 年长沙市的行政区划调整方案,长沙市下辖芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花 5 区和长沙、宁乡、望城 3 个县以及浏阳市。2008 年末全市国土总面积 1.18 万 km²,总人口 658.56 万人,其中市区总面积 964.58km²,市区户籍人口 237 万人。长沙铜官窑遗址位于湖南省长沙市望城县丁字镇彩陶源村,距长沙市约 27km;是唐代至五代时期制瓷遗址,距今约 1000 多年,属古遗址类。本项目为长沙铜官窑国家考古遗址公园建设项目,建设地点即为遗址所在地,见图 2-1。

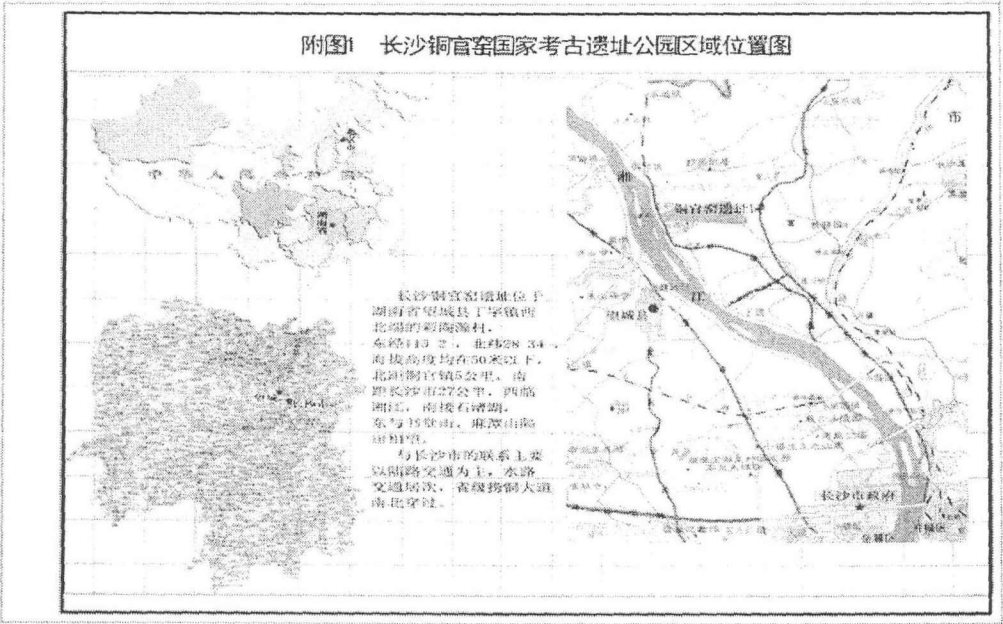


图 2-1 铜官窑国家考古遗址公园区域位置图

表 2-1 铜官窑项目建设条件

建设条件	具体细节
自然条件	长沙市地处亚热带，季风湿润气候区，每年雨季大约在 6 月~8 月之间。年平均气温为 17.2℃，最冷月平均气温（一月）4.7℃，最热月平均气温（七月）29.3℃，最大积雪深度为 20cm，最大冻土深度 5cm，主风方向 NW，年均风速 2.7m/s 年雷暴日数 49.5d，年日照时数为 1677.1h，年降水量 1393mm，日最大降水量 192.5mm，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），长沙地区地震动峰值加速度为 0.05g，本项目所在地地震抗震设防烈度为 VI 度
地质条件	长沙地区表层为第三级红土、红沙岩以及第四代冲积层，未发现有软弱地层，从工程地质条件考虑，红土，红沙岩化残积层和亚粘土层均为良好的地质基础持力层。项目所在场地具有良好的稳定性，地表层 0-17.5m 为冲击网纹粘土。承载力特征值 Fak=300Kpa~500Kpa，地下水深度为地平以下 17-18m 左右。土地高程 47-59m，高出湘江防洪大堤 4-6m。
供水、供电及电信条件	现状生活用水水源主要为地下水，无市政给水管网；电由村居民变电站供给；目前丁字镇电信模块及邮政所基本能覆盖本区域。
交通条件	本区域距离机场约 50km，离长沙市主城区 27km。区域与长沙市的联系主要以陆路交通为主，水路交通居次。2006 年底竣工的铜官窑大道是目前进入铜官窑遗址保护区的主要道路。 现状区域内部交通以村民生产生活形成的道路为主，全为泥土路面，道路质量与等级较低，居民生活、生产、出行十分不便，同时制约了本地区经济、文化等各方面发展。该区域目前尚无公交服务。

长沙铜官窑国家考古遗址公园的主要道路分布图见图 2-2。

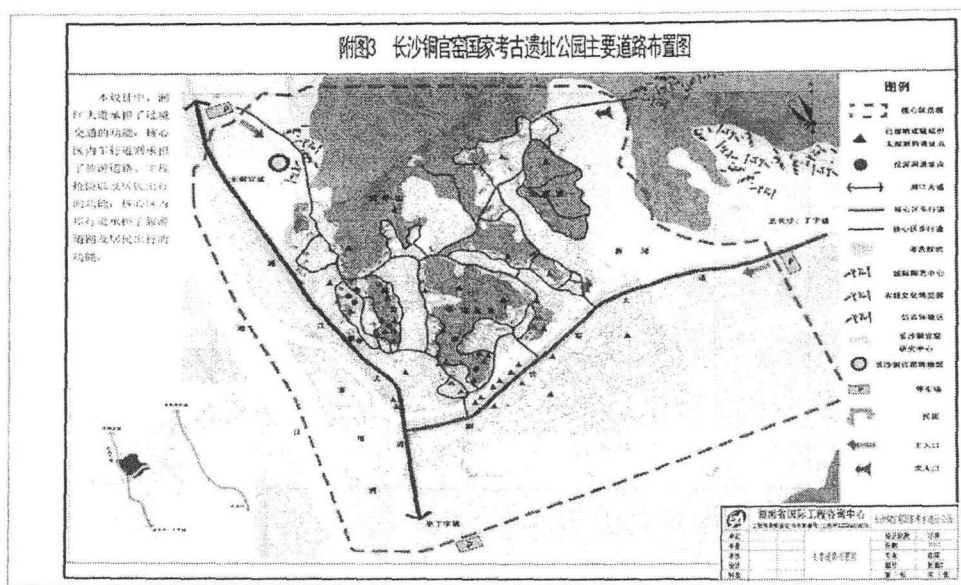


图 2-2 长沙铜官窑国家考古遗址公园的主要道路分布图

2.2 工程建设的必要性

长沙铜官窑国家考古遗址公园建设工程既具有文化遗产保护效用，也具有经济带动作用，该工程建设的必要性主要体现在四个方面：

(1) 保护文化遗产的需要。长沙铜官窑始创于唐代“安史之乱”后,距今已有 1000 多年的历史,是与浙江越窑、河北邢窑齐名的中国唐代三大出口瓷窑之一。^[16]与同类瓷窑相比,在技术上,长沙铜官窑突破了当时青、白瓷的单一色调,首创高温釉下多彩、铜红釉,以民窑的技术力量推动了陶瓷工艺的发展;在工艺上,长沙铜官窑将模印贴花、雕刻、书法、绘画、融入陶瓷装饰艺术中;在艺术题材上,通过丰富多彩的图形、造型各异的花鸟走兽、人物场景、诗词谚语,将浓浓的中华风情及异域文化融合在一件件器物上。因此,长沙铜官窑是一座蕴含了丰富的历史、科学、文化、艺术价值的古文化遗址,在我国的文明发展史上具有独特的意义。

但是，长沙铜官窑目前的保护工作正面临着一系列严重的问题。在遗址本体的保护方面：一是在 2km² 范围内，现已探明的居住、作坊、挖泥洞、市场交易、存货、码头以及墓葬等众多与窑址有关的遗存尚未进行全面、科学的考古发掘，致使后期的全面保护困难；二是长沙铜官窑遗址面积大，埋藏浅，文化

层裸露地表,山地水田随处可见瓷片、匣钵,俯首可拾的瓷片无法得到安全有效的监控、保护。大部分窑址堆积、烧窑取土形成的水塘和地下遗存无任何保护措施,极易遭盗掘等人为破坏;三是1964年重修开挖的彩陶溪破坏了原石渚湖堤岸地下遗存,同时地下遗存与建筑、道路相互叠压,在长期的人为和自然因素的影响下,遗址地表凹凸不平,尤其在有遗迹存在的地方,一旦雨季或洪水来临,局部低洼处积水难以排出,使遗址遭受进一步破坏;四是龙窑的窑址一般都分布在窑包上,由于这里土体松软,宜于植物生长,特别是乔木类植物根系破坏了窑体边壁和窑底。暴露于地表的龙窑极易发生风化,土体、砖体开裂,滋生苔藓、霉菌。同时由于遗址区内地下水深度较浅,冬季气温下降时有冻融现象,对地下遗存造成严重破坏。五是遗址区分布了许多挖泥洞,大部分坍塌,目前发现的只有谭家坡挖泥洞保存状况较好,但也濒临塌毁,急待抢救。

在与遗址相关的交通建设方面:一是按照长沙市城市总体规划,湘江大道在遗址公园段的现有路面将增加到约54m宽,这势必破坏遗址的完整性,也与遗址所要保持的生态景观相冲突。二是长沙铜官窑大道承载着东西方向主要的交通压力,道路沿彩陶溪流向与湘江大道交汇,大道现为混凝土硬质路面,主要承载防洪、抢险和交通功能,但道路及坝体构成单一,与遗址基本风貌、彩陶溪湿地、石渚湖农田景观极不协调,同时,由于道路缺少植物的遮挡、路面材质明度太高,容易造成眩光,严重影响到行人及司机的视线。

在民居建筑方面,现存民居建筑形态与自然环境及文化传统很不相称,同时,缺乏与之匹配的生活设施与市政设施。

因此,在上述情况下,迫切需要对集中体现文物价值的保护区约2km²区域首先加以规划保护,尽快实施保护方案,以达到保护文化遗产的目的。

(2) 传承文明的需要。文化遗产见证了中华文明的发展,承载着几千年文明信息,代表了中华民族传统文化的丰富内涵和发展的历史轨迹。保护好、开发利用好文化遗产对于传播文明、激发民族自豪感和爱国情具有不可替代的价值。^[17]

目前,由于建设滞后,长沙铜官窑遗址尚未对外开放。长沙铜官窑遗址核心保护区虽用简易围墙围护,并修建了谭家坡龙窑保护棚、游览道路、办公用房、传达室、门房、临时停车场,但这些设施均集中在很小范围内,远远不能满足总体保护的需要,更谈不上展示。同时,遗址区缺乏必要的服务设施,缺乏接待服务能力。此外,与外界的交通则主要以水路和陆路为主,路况、航道状况较差,进入性不强。

通过本项目建设,能够有效缓解长沙市城市文化遗产保护与城市化进程的矛盾,改善人居环境,实现文化、自然与人的和谐相处,使铜官窑成为中国传

统文化、中国古代陶瓷艺术、湖湘文化的展示平台,吸引社会大众走近长沙铜官窑遗址,为他们提供近距离触摸中国文化的机会,真正实现大遗址保护成果以及中华文明的与民共享。

(3) 挖掘文化遗产经济社会价值的需要。当前,随着居民收入水平和文化水平的提高,文物考古景点和遗址景观旅游正处于快速发展阶段,极大地促进了当地的经济社会发展。文物考古和遗址景观旅游目前已经成为居民的旅游消费热点。^[18]

项目所在地丁字镇为农村区域,属欠发达地区,因铜官窑而在2004年确定为“长沙地区历史文化村镇”。但目前铜官窑落后的展示设施和服务设施无法满足游客访古探秘的文化消费需求。同时,长沙铜官窑遗址缺乏完善的生态景观系统作依托,也无法满足游客生态休闲旅游的消费需求。不过,本项目具有很高的历史文化价值,这赋予了项目很高的旅游价值,因而也有很大的旅游开发潜力。通过本项目建设,将长沙铜官窑遗址建设成为集文物保护、教育、科研、旅游、休闲等多种功能于一体的“长沙铜官窑国家考古遗址公园”,这将使长沙铜官窑遗址的文化旅游价值得到较为充分的挖掘,为当地带来新的经济增长机会,为当地农民带来新的就业机会。因此,项目建设具有很大的经济社会价值。同时,对于长沙市而言,项目建设还能丰富城市的文化内涵,加强居民对长沙的认同感和凝聚力,促进长沙的和谐社会建设和旅游业的发展。

(4) 本项目建设对大遗址保护、展示、研究和国际文化交流具有重要意义。本项目建设以国家文物局下发的《关于铜官窑考古遗址公园概念性规划的批复》为指导,以本体保护和展示为主要内容,对长沙铜官窑遗址进行急需的本体保护工程、保护性设施工程、保护管理工程建设,以解决长沙铜官窑遗址及其生存环境存在的严重现实问题和威胁,从而充分发挥长沙铜官窑遗址文化遗产在传承中华文化、提高人民群众思想道德素质和科学文化素质、增强民族凝聚力、促进社会主义先进文化建设和构建社会主义和谐社会中的重要作用,充分发挥长沙铜官窑遗址文化遗产在促进国际文化交流、维护世界文化多样性和创造性及促进人类共同发展中的重要作用。

第3章 市场分析预测及建设规模

3.1 市场分析预测

3.1.1 遗址景观旅游市场发展现状

遗址是指人类活动的遗迹,属于考古学概念。遗址的特点表现为不完整的残存物,具有一定的区域范围,很多史前遗址、远古遗址多深埋地表以下。^[19]埋藏地下的遗址的发现多与人类活动有关,如农业生产、建筑工地施工等;很多古代遗址属于探险发现。古代城市、古代建筑遗址多为残垣断壁,各种生活用品表现为残破和不完整,但可以通过考古和人类学研究寻找人类生活轨迹。很多遗址属于战争、灾难之后的遗存。遗址景观旅游是以文化遗址为依托,集旅游、休闲、教育等多种功能为一体的综合性旅游。与其它生态休闲旅游不同,其独特性在于遗址景观,遗址景观旅游既能够为游客提供古文化的意蕴,带来文化的享受,又能给游客以启示和教育。

正由于遗址景观能够为游客带来多重价值,遗址景观,尤其是一些著名的遗址景观吸引了众多的游客前往参观旅游。国内如秦始皇陵遗址公园、长城等。随着旅游业的纵深发展,一些不为人们所熟知的遗址景观也正成为新的旅游消费热点。如河姆渡遗址博物馆、三星堆博物馆、半坡博物馆、大汶口文化博物馆、良渚文化博物馆、周口店、安化茶马古道等。据有关资料显示,河姆渡遗址博物馆在2000-2004年间每年只有7万名左右游客。而自2009年5月26日重新开馆至6月26日期间参观人数达4.5万余人次,特别是5月26日—31日六天时间内,日均游客近0.4万人,游客总量达2.3万人次;2009年三星堆游客规模约在35-38万人次之间;而与铜官窑一江之隔的中国历史文化名镇——靖港古镇自2009年9月25日开放至10月8日,就接待游客约55万人,特别是在“十一”黄金周期间,每日接待游客数量约5万人。

3.1.2 市场定位和客源市场分析

本项目定位为集文物保护、教育、科研、旅游、休闲等多种功能于一体的国家考古遗址公园。其客源市场主要有四类。

(1) 基础市场

长沙市市区居民、望城县、长沙县、宁乡县、浏阳市、湘阴县等周边县市的城镇居民,将构成项目的基础客源市场。这是一个超过300万人口规模的市场。

(2) 重点市场

由于其区位、交通、经济发展状况等因素的影响，长株潭城市群成为项目最大的市场腹地，主要原因是包括长沙、株洲、湘潭、益阳等主要城市经济发达、人口规模大、出游率高，为项目提供了一个很大的本地客源潜在市场。

(3) 机会市场

项目的机会市场主要来源于周边著名风景名胜区、景点的分流市场，主要包括到长沙出差、商务和旅游的游客，还包括周边其它景区的分流市场。

(4) 专业市场

由于项目具有很高的考古和文化价值，来自全国甚至全球的相关陶瓷、考古、高校、政府职能部门的专家、学者将成为遗址公园的专业市场，是公园在专业领域实现品牌提升的中坚力量。

3.1.3 重点客源市场人口规模

项目重点客源市场以长沙、株洲、湘潭、益阳四个城市的城镇人口为主，2008 年四市城镇人口规模详见表 3-1。

表 3-1 项目重点客源市场人口规模（2008 年）

城市	城镇人口
长沙市	395.15
株洲市	186.12
湘潭市	145.35
益阳市	185.89
合计	912.51

3.1.4 游客规模预测

项目的市场规模取决于项目所依托的重点客源市场的人口规模、经济状况、出游意愿和项目本身的吸引能力及服务、配套设施能力等因素。由于项目尚未对外开放，缺少相关的数据进行分析，其可行的办法，一是参照相关类似项目进行大致的估算，二是根据重点客源市场人口规模、经济状况、出游意愿、项目提供的价值、项目配套条件等因素进行估计。

从第一个方法看，可类比的有河姆渡遗址博物馆、三星堆等。河姆渡遗址博物馆于 2009 年 5 月 26 日重新开馆，半年游客规模在 30 万人次左右，而三星堆游客规模约在 35-38 万人次之间。而与铜官窑一江之隔的中国历史文化名镇

——靖港古镇 2009 年“十一”黄金周期间，每日就接待游客数量约 5 万人。可见，由于所依托的重点市场的不同，游客规模有很大的不同。

从第二个方法看，项目所依托的重点市场人口规模为 912.51 万人（2008 年值），这一市场区域，尤其是长株潭区域是湖南省经济发展水平最高的区域，也是消费力最强的区域。相对国内其它城市群，该区域还有一个特点就是居民消费欲望强，消费水平高。在这样一个市场条件下，如每年有 5% 的人口前来参观旅游，则年游客规模可达 45.6 万人次。而 2009 年我国居民出游率达 1.42，城镇居民则更高。再参照河姆渡遗址博物馆、三星堆等项目的游客规模，这一规模应是完全有可能的。

3.1.5 环境容量测算

由于项目为遗址公园，必须实施保护区环境容量监控。保护区环境日容量计算公式： $C=A \times T / A_0 \times T_0$ 。其中 C 指合理环境容量（人次/日），A 指可利用基本空间规模（ m^2 ）， A_0 指人均空间最低标准（ m^2 /人），T 指保护区每日开放时间（小时/日）， T_0 指人均每次利用时间（小时/人·次）。通过测算，遗址保护区展示利用场馆与游步道总面积，即 A 约为 34385 m^2 ， A_0 以 20 m^2 /人计，T 以 8 小时计， T_0 以 2.5 小时/人·次计，则遗址保护区合理环境容量 $C=5501$ 人次/日。每天最大游人总数应控制在 5500 人以内。

根据每天最大游客容量，考虑长沙地区旅游的特点，按每年参观日 225 天计算，并考虑淡旺季差别，同时参考国内类似遗址游客容量控制水平，每年最大游客容量控制在 41.3 万人左右。

3.2 建设规模的确定

根据以上对市场的有关分析与预测，结合本项目的有关实际情况，拟定本项目建设内容及规模为：新建展示及景点标识标牌、考古调查与发掘，重要遗迹的保护等；重建 7 层宝塔；新建或改造遗址公园内道路、新建 3 个停车场、新建水、电等配套工程设施建设；核心区居民拆迁安置及民居改造；新建彩陶溪水利水系工程、生态保护与环境整治等工程；新建旅游环保厕所 4 个，垃圾及污水处理设施；建设游客服务中心及管理用房等旅游配套设施，详见表 3-2。

表 3-2 项目建设内容表

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	考古调查、发掘	m ²	4800	
2	遗址本体保护	处	3	
3	遗址展示工程			
3.1	遗址大标示点保护棚	条、个	9	7 条大龙窑、2 个挖泥洞
3.2	遗址小标示点保护棚	条	38	其他 38 多条龙窑
4	围护围栏	m	5000	
5	栈道架设	m ²	2000	
6	重建宝塔	座	1	
7	服务中心及管理用房	m ²	2000	
8	环保厕所	座	4	
9	标示、标牌等	块	500	
10	垃圾筒	个	200	
11	垃圾收集站	座	2	
12	道路	m ²	72060	
13	停车场	m ²	3600	
14	环境整治工程			
14.1	彩陶溪疏浚工程	m	4800	
14.2	泥水港口一级提水机台	座	1	
14.3	觉华山二级提水机台改造及其引水渠清淤	m	5000	
14.4	觉华山至南村塘抗旱明渠硬化	m	5000	
14.5	吾家庄山塘清淤	亩	28	
14.6	钢筋桥拦河坝坝桥结合工程	座	1	麻石仿古桥 30X6m
14.7	古城大桥至黄士潭河坝段	m	1500	
14.8	居民拆迁、安置等	户	70	264 人（一期）
14.9	民居改造	栋	130	
14.10	污水处理	座	2	

第4章 项目方案的制定

4.1 考古遗址保护方案

长沙铜官窑遗址的保护方案包括考古调查与发掘方案和遗址本体保护的方案。考古发掘与研究是国家考古遗址公园工作的基础。科学的论证和规划是大遗址保护与利用实施的关键。规划是否科学合理到位,最重要的是对大遗址的价值、特点、状况等经过考古调查、发掘、研究达到的认识,这些都离不开长期全面系统的考古工作。^[20]国家考古遗址公园的建设,离不开遗址的展示,而遗址的展示,必须通过科学的考古工作,使遗址的形象、内涵得到真实清晰的体现。

4.1.1 长沙铜官窑遗址目前发现状况

(1) 从窑区分布范围来看,大多位于八大邱垅中部(尖子山东部)、细山子东部、长坡南侧、谭家坡北侧、胡家垅北侧、挖泥墩北侧及西侧、古城机台、彩陶溪堤外侧、古城大桥、堤委会南(抽水机站)、蓝岸嘴南线、灰坪南线、廖家坝南线及东侧

(2) 除原调查发现 19 处挖泥洞遗迹,目前有的已毁或压在农户房屋下。

4.1.2 遗址本体保护方案

1. 文物本体保存状况调查。根据现场考察和考古资料介绍,该遗址文物本体主要有三类(不包括已提取的文物),其保存状况依次说明如下:

(1) 瓷器烧制场遗存

瓷器烧制场遗存如谭家坡 1 号龙窑,谭家坡 1 号龙窑已处于专门修建的保护室内,保存状况处于稳定状态。涉及保护修复的问题主要有:窑壁砖体开裂;窑壁变形坍塌;砖体表面严重风化;烧结土风化,丧失强度;烧结土脱落露出纯土质。此外注意到 2002 年的试验区,窑底部分有泛白现象,需要处理。

(2) 挖泥洞遗存

挖泥洞遗存分为坑式、井式和洞式三种^[21]:坑式挖泥洞,为原露天开挖的采泥场所,后废弃以致积水成塘;井式挖泥洞,为向下垂直挖掘采泥的场所,废弃后历经多年已生长布满苔藓地衣低等植物;洞式挖泥洞,为横向往内挖掘的采泥场所,原木质支护已朽毁,且内有坍塌,土质潮湿。

(3) 烧制废弃物遗存

包括废弃物堆集场和这些废弃物的利用场所(如交易湖港岸构建物)这种

废弃物目前还处于地下，估计将来发掘出来时，均会有湖泥的混杂。^[22]

2. 文物本体保护原则

(1) 着力保护文物本体的现状（或发掘出土原貌），充分反映其文物价值；

(2) 技术加固保护与生态环境相协调，坚持应用绿色环保的适用材料和工艺；

(3) 化学处理方法与建筑工程方法加固保护相结合；

(4) 文物本体保护要考虑文物展示陈列，把二者有机地联系起来。

3. 文物本体的保护策略方案

(1) 瓷器烧制场遗存

对于瓷器烧制场遗存以考古发掘清理完的现场为保存现状，来加以保护，除对影响龙窑结构稳定性的残损处进行修复外，只作本体加固保护。主要工作步骤如下：首先进行发掘性清理；对窑址底部试验区泛白物进行清除；对窑址底部向下的裂缝，用现场的土粉进行填补；对影响结构稳定性的残损处进行修复（用遗址内同质材料，进行粘接、锚固或砌筑）；用绿色环保有机硅渗透加固剂进行整体、伞面处理；窑址周围修筑隔水防水设施；重新修建保护展示棚。

(2) 挖泥洞遗存

对于挖泥洞遗存，按坑式挖泥洞、井式挖泥洞、洞式挖泥洞三种不同式样分别采用相应的方法作保护：^[23]

a. 坑式挖泥洞，选择现状保护，具体做法是在其周边砌筑供参观的道路，并设置适当的安全警示和内容说明标牌；

b. 井式挖泥洞，进行原生态保护，只须在“井”的四周种植适当的灌木作围栏，并设置安全警示和内容说明标牌。周边道路同样用烧制废弃物构筑；

c. 洞式挖泥洞，宜采用如下方法进行保护。清理掉已经坍塌的泥土；根据考古发掘资料复原洞体的支护体，所用木构件应先进行防腐处理；洞内放置物理吸湿材料（如木炭和变色硅胶）；依托洞体支护体架设电线，安装照明，通风排水和影像观察系统。

(3) 废弃物遗存

对于废弃物遗存，按发掘原状进行保护，由于它处于露天状态，且有湖泥混杂，宜先用绿色环保的有机硅渗透加固剂进行处理（主要是为了混杂湖泥的加固），再用绿色环保的有机硅憎水剂处理，使废弃物和混杂湖泥都具有良好的防水性。

4. 文物本体化学加固保护技术措施

(1) 材料选择

有机硅材料因其分子结构的特点而具备许多优良的性能。特别是耐候性，防水透气性以及和硅酸盐材质（包括陶瓷、砖土）物体的相容性，而且实践证明了其在砖土质文物保护中的有效性，因此选择有机硅材料作为长沙铜官窑文物本体化学加固保护的材料。有机硅材料品种繁多，根据要保护的对象及要解决的问题，主要选择二种绿色环保的有机硅保护材料：有机硅渗透加固剂和有机硅憎水封护剂。

（2）处理方法

有机硅渗透加固剂，采用整体喷淋，局部滴渗或涂刷的方法进行处理，每次三遍，每一遍以渗到吸不进为止，5-7天后视情况可再进行一次；有机硅憎水封护剂，采用整个喷淋，局部涂刷的方法进行，每次三遍，每一遍以全部喷湿为止。

（3）用量控制

有机硅渗透加固剂，按实际被处理对象表面积计，总体平均为 4-6L / m²；有机硅憎水封护剂，按实际被处理对象表面积计，总体平均为 1-2L / m²。

4.2 文化遗产展示方案

4.2.1 考古过程展示

体验考古发掘是普及和提高广大考古爱好者考古知识的最好机会。本公园的考古发掘将可同时安排兴趣爱好者在不影响正常的考古计划及秩序的前提下，与考古工作人员进行同步的考古体验。可按计划对考古现场进行发掘整理，并且为了使考古知识更具普及性，拟在核心区外的唐村处另选址作为模拟考古现场，让更多的人加入考古过程，从而增强全民的文物保护意识。^[24]为了方便考古爱好者体验长沙铜官窑考古遗址过程展示的乐趣，设置了蓝岸咀考古体验区和唐村考古体验区。

4.2.2 文化遗产遗址展示方案

1. 展示区设置

在考古遗址公园内拟设置四组遗址展示区：

- （1）第一组由谭家坡一号龙窑及挖泥洞等组成；
- （2）第二组由陈家坪龙窑及挖泥洞等组成；
- （3）第三组拟设置在核心区外，可按龙窑的形制进行复原仿制，供游人进行体验制陶；
- （4）第四组是对已探明但尚未发掘整理的遗址，设立标志棚进行提示和保

护。其中一、二、四组展示区均只能参观不可烧制体验。在考古遗址公园内,对已发掘并整理完毕的遗址全部进行恰当的保护,结合参观展示,选择具有典型意义的遗址设置建筑物和构筑物加以保护。

2. 保护展示措施

(1) 第一组谭家坡遗址区保护展示措施

对保存较好的谭家坡龙窑和挖泥洞进行重点的保护展示设计,如:做好全面的本体保护措施、修建保护性建筑物、对其周边进行清理,去除有害植物。对其他保存状况较差的遗址,清除遗址上的杂草灌木及深根系植物,显现出龙窑形状,并在旁边设立指示牌加以说明。采用多种展示手段并架设绕山而行的栈道,让游人能清晰的观摩到遗址区丰富的陶片、匣钵堆积层。^[25]在各遗址点,设计遗址标识亭、游线指示牌,向游人详细介绍长沙铜官窑的历史变迁及在世界陶器史上的地位等内容。

(2) 第二组陈家坪遗址区保护展示措施

对保存较好的陈家坪龙窑和挖泥洞进行重点的保护展示设计,并在建筑造型与展示手法上与谭家坡遗址区稍做区别,以体现当地窑口、作坊的建筑特点为主。其他保存状况较差的遗址,与标识系统的展示方式,类同于谭家坡遗址区;对陈家坪靠湘江侧遗存丰富的挖泥洞,进行全面的清理,用步行游道串联,形成一个数量庞大的挖泥洞遗址展示区。保留部分民居,对其进行内部功能改造,让游人可以在民居内通过声光电手段学习到铜官窑流传千年的制陶工艺。

(3) 第三组陶瓷创作体验区

拟设置在宝塔附近,可按古龙窑、古作坊的形制进行复原仿制,供游人体验从挖泥、制陶到烧窑的全过程,让长沙铜官窑传承千年的制陶手工艺得以延续,也是为了更好的保护这笔不可多得的非物质文化遗产。

(4) 第四组埋藏遗址标识区

对已探明但尚未发掘整理的遗址,设立标志棚进行提示和保护,这类标识棚可以方便的拆卸,不会阻碍将来进一步的考古发掘。

3. 遗址博物馆展示

为了更科学的向世人展示长沙铜官窑的有关风貌,拟新建长沙铜官窑遗址博物馆(长沙铜官窑遗址博物馆建设应另行单独进行可行性论证,本可研不计投资),博物馆的建设应遵循以下原则:

(1) 体现中国传统建筑的气韵和理念,结合地形地貌、周边其它建筑景观,力求做到了无痕迹;^[26]

(2) 强调长沙铜官窑的传统制陶工艺的继承与发展,强调长沙铜官窑外销

瓷窑的历史特征，昭示出博物馆独特的地域特色和文化内涵；

(3) 采用国际上最先进的展示手段，再现当年长沙铜官窑繁荣兴旺的生产景象，生动的向人们展示和讲叙长沙铜官窑的历史故事；

(4) 建筑功能设计上要以文物保护为基本前提，采用国际文物保护展示的要求为基本标准；

(5) 功能分区要求：展示区、文物库房、观众服务区、办公区、其它配套服务区。^[27]

4. 长沙铜官窑研究中心展示

为了更好的发掘和研究长沙铜官窑，遵循铜管窑文物考古遗址公园整体概念性规划理念，湖南省文物考古研究院正在长沙铜官窑国家考古遗址公园附近新建长沙铜官窑研究中心，承担着长沙铜官窑文物保护、学术交流、科研成果展示的功能。研究中心可向游人开放，使人们在领略中华瓷窑遗址文化的同时，还能学习到一些关于考古与文物保护方面的知识。长沙铜官窑研究中心的建设将大大的促进长沙铜官窑国家考古遗址公园加快走向世界的步伐。

4.3 工程建设方案

4.3.1 建筑

1. 主要建筑标准与参数

- (1) 建筑结构设计使用年限 50 年，其中保护棚 25 年；
- (2) 耐火等级二级，其中保护棚、附属用房为三级；
- (3) 结构安全等级二级；
- (4) 防水等级二级；
- (5) 抗震设防烈度Ⅵ度。

2. 修复宝塔

为了让长沙铜官窑国家考古遗址公园更显古色古香，拟选址在觉华山西南脚修复原有宝塔。宝塔 7 层高，为詹砖塔，古旧化、底面积控制按原塔，内设木梯登高，塔高仿原塔（控制 14-20m 高）。

3. 展示与服务等配套工程

- (1) 管理系统。新建或利用遗址区内民居改造为办公管理及旅游服务用房；
- (2) 服务系统。修建停车场、厕所、小卖部、座椅、垃圾筒等基本服务设施；
- (3) 标识系统。按照有关规定设置文物保护范围标牌、总体说明标牌、资

料说明牌等标识系统，并沿参观路线设置一定的导游牌，以方便游客游览；^[28]

（4）解说系统。设置电子语音导游系统，陈列提示可结合重要文物设置语音解说或多媒体演示设施。

本项目主要建构筑物详见表 4-1。

表 4-1 建构筑物一览表

序号	项目名称	数量	主要建设内容及建筑结构形式
1	遗址大标示点保护棚		保护遗址，方便展示，金属轻钢结构棚架
2	遗址小标示点保护亭		保护遗址，方便展示，金属轻钢结构棚架
3	栈道架设	500 m ²	挖泥洞瓷片堆积区供展示保护遗物，钢木支架栈道。
4	出入口广场及停车坪、大门	1500 m ²	其中生态停车坪 700 m ² ，广场大门 500 m ² ，大门古装开放
5	服务中心及管理用房	2000 m ²	游客服务中心及部分遗址区管理用房，二层砖混结构，浅基础，层高 3.6m
6	公共厕所、门卫等附属用房	200 m ²	环保厕所，4 个，一层砖混建筑，3~3.6m 高
7	围护围栏	5000m	浅基轻钢透空围栏
8	标志牌、标示牌、警示牌	200 处	包含遗址地表植被固土绿化标识、景点路牌标识等
9	修复原有宝塔	1 座	7 层詹砖塔，古旧化、底面积控制按原塔，内设木梯登高，塔高仿原塔（控制 14~20m 高）
10	垃圾筒		设置环保垃圾筒
11	污水处理设施		新建污水处理系统

4.3.2 道路

1. 道路类型。在本可研中，考古遗址公园内道路依据功能分成以下几种类型：

（1）过境交通。湘江大道为了尽量减少与考古遗址公园无关的车辆过境，避免噪音、废气、震动对遗址、堤坝以及景观视觉上的影响，结合湘江风光带的设置，考虑在满足通行能力的前提下，考虑最佳的过境方案。

（2）工程抢险所需之道路。在考古公园内，主要的两条干道即湘江大道和铜官窑大道都是结合堤坝形成的。这两条干道主要还承担了在紧急时刻开上大

型工程抢险车和大型物料运输车的功能。

(3) 通达各民居的机动车辆运输道路。由于考古遗址公园内尚有许多民居, 所以存在着运输的需要。

(4) 旅游参观路线。考古遗址公园内散落各处的遗址遗存点, 采用接驳访客机动车的电瓶车道路。

(5) 保留原有居民因劳作出行形成的步行道路, 以方便居民及游人的行走。

2. 道路新建或改造方案

(1) 对过境的湘江大道属市政道路。

(2) 铜官窑大道。铜官窑大道大约 10m 宽, 先承载东西方向主要的交通压力, 道路沿彩陶溪流向与湘江大道交汇, 大道现为混泥土硬质路面, 主要承载防洪、抢险和交通功能, 但道路与坝体构成单一, 与遗址公园基本风貌、彩陶溪湿地、石渚湖农田景观极不协调。由于道路缺少植物的遮挡、路面材质明度太高, 容易造成眩光, 严重影响到行人及司机的视线。^[29]在遗址公园的总体交通规划缓解铜官窑大道(遗址公园段)交通压力的基础上经交通流量推算在不增加防洪大坝及路面宽度的情况下, 仅对路面材质进行调整, 降低混凝土路面的明度。在堤坝两边, 尤其是靠彩陶溪方向建立观光设施, 如观景平台、栈道、亲水平台和凉亭构架等, 对原有坝上的修建使其在线路设计上与对岸的景观呼应与连接, 该道路改造后主要承载内部机动车、电瓶车以及游人的交通功能。铜官窑大道红线控制宽度 28m, 其中路面宽 15m, 为双向 4 车道设计, 道路两边各设 3m 宽人行道及 3.5m 宽绿化带。

(3) 核心区内道路交通。考虑到对境内交通状况的改善及旅游事业的发展, 在 220ha 的建设控制地带范围内修建 4 条景观车行道, 道路红线宽度 15m, 其中路面宽度 7m 为双车道设计, 道路两边各设 2.5m 宽人行道及 1.5m 宽绿化带。道路采用改性沥青路面, 人行道采用广场砖铺砌, 道路两旁绿化带及行道树应采用常青本地树种以防外来物种入侵破坏环境。^[30]在核心区内规划一条能够体验铜官窑区域窑工生活以及陶瓷生产、销售、运输的游览线路, 并结合遗址地点、景观地点、休闲娱乐地点, 达到旅游线路的顺畅和舒适性, 旅游内容的丰富性, 充分感受生态风光的优美, 感受自然的趣味。本次项目需改造或新建步行道约 5km, 宽 2-4m, 可根据实际情况采用青石板路面或卵石路面, 并在道旁布置合适的休息小亭或垃圾箱等设施。

3. 停车场

为了方便游客停车, 本项目拟在核心区外沿湘江大道及铜官窑大道等距设置三个停车场。每个停车场远景规划 100 个停车位, 面积均为 1200m², 共

3600m²。在核心区内，外来车辆均停在停车场后通过用电瓶车接驳至各参观节点。电瓶车的停车方式是沿路就近停靠。民居点的停车因量比较小，不采用集中停车方式，而在室前屋后适当停放。

4. 道路建设主要工程量

本次道路建设的内容为长沙铜官窑国家考古遗址公园内的道路建设，其中：遗址公园内主要道路总长 6.48km，各道路长度详见表 4-2。步行道长度约 5km。

表 4-2 主要道路系统一览表

序号	道路名称	道路长度(m)	路面宽(m)	人行道宽(m)	绿化带宽(m)	挖	填	绿化带(m ²)	行道树(株)
1	铜官窑大道	1400	7	5	3	1.75	18.9	1.96	560
2	一号景观车行道	1500	7	5	3	2.7	2.25	0.45	600
3	二号景观车行道	1380	7	5	3	2.59	2.07	0.4	552
4	三号景观车行道	1300	7	5	3	2.44	1.95	0.39	520
5	四号景观车行道	900	7	5	3	1.69	1.35	0.27	360
	总计	6480				11.17	26.52	3.47	2592

4.3.3 给水排水

1. 给水

(1) 水源。现状用水水源主要为地下水，取水方式为各居住户通过打井，但地下水水质不佳、水量有限，根据规划本项目用水水源考虑从望城水厂和捞霞长沙市第六水厂联合供应。

(2) 用水量。

a. 旅游用水量（根据环境容量计算）：遗址保护区合理环境容量 C=5501 人次/日。每天最大游人总数应控制在 5500 人以内，取 6L/人•d，则旅游最大用水量为 33m³/d。

服务及管理人员生活用水量：2km² 内居民和服务点及服务部工作人员合计约 1000 人，按 280L/人•d 用水量计算，预测服务及办公人员生活总用水量为 280 m³/d。

b. 安置区居民用水量：搬迁安置区共有安置居民 139 户 527 人，按 280L/人•d 用水量计算，安置区居民生活用水量为 147.56 m³/d。

c. 项目区总用水量为 460.56m³/d，其中拟建项目区用水量 313m³/d，居民安置区用水量 147.56m³/d。

(3) 给水系统。根据《望城县域城镇体系规划》和《望城县城乡一体化与村庄布局规划》。确定生活用水水源考虑从望城水厂和捞霞长沙市第六水厂联合供应。经太丰路到滨江大道，在公园山下设一套无负压设备供水，供水至公园的生活、消防水池，水池有效容积 500m³，水池应有保证消防用水不作它用的技术措施，消防用水量为 216m³。在和展示区、服务点、停车场、相对游客集中的地方及文物保护场所配置室外消防栓。

(4) 开水供应。各景区按需设置电开水器，单台容积 70L，功率 6kW。

2. 排水。区域内雨水排水与生活污水分流排出。

(1) 生活污水系统。项目建设区生活污水总排水量按用水量的 80%计，则排水量为 250.4m³/d，排水经污水管网收集后进入化粪池预处理，排入地埋式污水处理站进一步处理（处理规模为 15m³/h，选用型号为 WSZ-15 地埋式污水处理系统），污水处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，达标后外排至湘江。居民安置区生活污水总排水量按用水量的 80%计，则排水量为 118.1m³/d，排水经污水管网收集后进入化粪池预处理，排入安置区地埋式污水处理站进一步处理（处理规模为 10m³/h，选用型号为 WSZ-10 地埋式污水处理系统），污水处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，处理达标后排入彩陶溪。

(2) 雨水系统

a. 雨水量

暴雨强度公式

$$q=\frac{2150.5\left(1+\lg T\right)}{\left(t+13.275\right)^{0.6846}}$$

设计重现期：P=1a

设计降雨历时：t=t₁+mt₂，m=2

地面集水时间：t₁=10min

雨水设计流量按《室外排水设计规范》规定的公式 Q=qψF

Q 雨水设计流量（L/s）

q 设计暴雨强度（L/s.ha）

F 汇水面积：F=200ha

地面综合径流系数：取 ψ=0.55

雨水设计流量 22422（L/s）

区域内雨水排水与生活污水分流排出，利用自然地形就近分散外排。

b. 保护区和游步道的雨水。为了确保保护区、游步道不受雨水径流的冲刷、侵蚀和污染,在保护区、景物外围或游步道的上坡 10m 以上处开明渠,设沉沙池,有计划地将雨水排入溪流;

c. 接待区、居住区雨水。在来水侧设截水渠,将雨水拦截导流到区外,区域设明暗渠相接合的排水系统,以便有效迅速地排除地表水。

d. 在室外道路边适当位置设置平算式雨水口、收集道路、人行道及屋面雨水;雨水管采用承插式钢筋混凝土管,橡胶圈接口。并设混凝土基础;雨水口、雨水检查井均采用砖砌筑。

4.3.4 电气

(1) 负荷等级。遗址公园各景区消防用电为二级负荷,其他用电负荷为三级负荷。

(2) 电源状况。公园景区已架设一条从附近的 110kV 变电站架空引来的 10kV 线路,该线路供电稳定、可靠,能满足公园景区用电需求,公园景区 10kV 电源即可从该线路上 T 接引来。

(3) 用电负荷。公园景区其他用电负荷设备容量约为 1440kW,计算容量为 1008kW,视在计算容量为 1120kVA,故选用 4 台 400kVA 的变压器能满足公园景区其他地方用电需求,变压器负荷率为 70%。

(4) 户外箱式变电站

因公园景区面积较大,用电负荷较分散,故在景区其他地方选用 4 套 400kVA 的 10kV 户外箱式变电站,其 10kV 电源由中心变电站引来,将 10kV 电源降为 220/380V 后对景区其他低压用电设备供电。

10kV 户外箱式变电站尽可能设置在靠近负荷中心、便于进出线和交通运输方便的地方。10kV 户外箱式变电站低压供电半径一般控制在 500m 范围内,以保证最大负荷时线路末端能满足各种用电设备正常工作。

箱式变电站将高压开关设备、变压器、低压配电设备按一定接线方案组合成一体,由变压器室、高压室、低压室组成,目字形布置外壳。高压侧采用环网式开关柜。变压器高压侧采用负荷开关熔断器保护,低压侧采用塑壳开关保护。变压器选用 SCB11 型节能干式变压器,安装超温保护。箱式变电站低压侧配电装置采用固定式安装,进线开关、出线开关选用塑壳式断路器,断路器设过负荷保护和短路保护,低压侧电源采用放射式向各用电点供电。为保护变压器和其他受电设备,箱式变电站内装设避雷器。

(5) 应急电源。为满足停电情况下,消防用电设备、宝塔展览陈列区照明等二级负荷用电的需要,拟选一台 90kW 柴油发电机组作应急备用电源,在正常情况下,当工作电源停电时,发电机向二级负荷供电,以维持正常工作。严禁应急电源与工作电源并列运行。二级负荷采用双回路供电,末端互投。柴油发电机组采用箱式户外型柴油发电机组,置于户外箱式中心变电站附近。

(6) 10kV 配电网。公园景区内 10kV 接线采用环网接线的方式。为不影响景区景观,景区 10kV 电源线路均采用 YJV22-8.7/10kV 型高压电缆直埋地敷设,南北向道路沿东边敷设,东西向道路沿南边敷设。

(7) 配电照明系统。配电设计以满足建筑或工艺要求、安全生产、技术先进为原则。配电设备的安装布置遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。照明动力配电分别设置独立的配电系统。^[29]建筑物内电气照明系统采用三相五线制,照明光源根据使用场所的不同,合理地选择光源的光效、显色性、寿命等光电特性指标,为达到较好的照明效果和节约能源的目的,灯具和光源尽量采用节能型产品。

(8) 220/380V 户外低压供电线路及道路照明。220/380V 户外低压供电线路及道路照明采用 YJV-0.6/1kV 型电缆沿电缆沟敷设或 YJV22-0.6/1kV 型电缆直埋地敷设引至用电点。路灯照明采用造型优美的高压钠灯,以衬托景区优美的环境,路灯照明配电时尽量保持三相平衡。^[31]

(9) 防雷接地。户外箱式变电站均安装一组接地装置,接地电阻要求不大于 1Ω ,供变压器中性点接地和避雷器接地用。宝塔属第三类防雷建筑物,防直击雷的措施采用装设在建筑物上的避雷带构成接闪器,利用建(构)筑物混凝土内钢筋做引下线和接地装置。雷电电磁脉冲防护等级为 B 级,在低压配电系统中采用 2-3 级电涌保护器进行保护。

(10) 火灾自动报警系统。宝塔火灾自动报警系统保护对象为一级,采用集中报警系统。在一层消防控制室内设火灾报警控制器,消防设备联动控制柜,火灾事故广播通讯柜等。在宝塔各层设火灾探测器、声光报警器及手动报警按钮等设备。扬声器置于楼内的公共场所,在楼内主要出口处均设消防电话插座孔。

火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。消防控制、通信和报警线路采用暗敷设时,应采用穿金属管敷设在不可燃体的结构层内,且保护层厚度不小于 30mm。

（11）有线广播系统。公园景区内设置有线广播系统，将服务性广播系统和火灾应急广播系统合并为一套系统。在平时可播放背景音乐、新闻、通知等，若有火警，则可发出报警，进行疏散工作。

（12）电视、通信、信息网络及综合布线系统。在公园景区建立一个信息网络、综合布线系统，该系统由电话网、宽带接入网、有线电视网和控制网等组成。该系统根据其功能的不同，配线结构采用综合布线与单独布线相结合的布线方式。综合布线系统应满足建筑群内信息网络与通信网络的布线要求，应能支持语音、数据、图形等多媒体业务信息传输要求，综合布线系统是建筑群内信息、通信网络的基础传输通道。每个功能单元按需要设置电视、电话和计算机信息点。在信息插座上接上电话或计算机即可与外界进行图像、数据和语音交流，使其成为信息服务系统平台。^[32]

（13）电视监控及防盗系统。在园区安装电视监控及防盗系统，采用数字化电视监控系统，监控主机设在一层监控中心，监控中心可与消防控制室合用，配有硬盘录像机、电视墙、防盗系统等。在园区重要的展示部位安装摄像机进行监控，监控中心可自动或手动切换系统图像，可对摄像机云台及镜头进行控制，可对所监控的重要部位进行 24 小时持续录像。

（14）供电主要设备表。供电主要设备见表 4-3。

表 4-3 供电主要设备表

序号	名 称	型 号	单位	数量	备注
1	户外箱式中心变电站	ZB304-315/10~400/10	套	4	
2	户外箱式柴油发电机组	90kW	套	1	

4.4 组织机构及劳动定员方案

4.4.1 组织机构

根据国家有关投资政策，政府投资项目必须实行项目业主制，本项目成立湖南长沙铜官窑建设开发有限公司，公司设董事长一名（法人代表），董事会下设总经理负责制。组织机构见图 4-1。

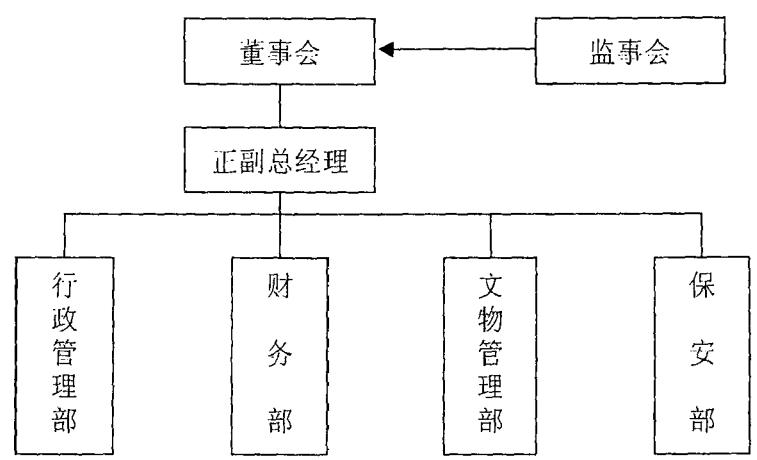


图 4-1 组织机构图

4.4.2 劳动定员

劳动定员见表 4-4。

表 4-4 劳动定员表

序号	部 门	人数	备注
1	总经理	1	
2	副总经理	1	
3	行政管理部	16	其中：主任 1 名
4	财务部	3	其中：部长 1 名
5	文物管理部	30	其中：部长 1 名
6	保安部（含解说、服务人员）	129	其中：部长 1 名
	总计	180	

4.4.3 人员培训

为了提高服务质量，其服务人员必须具有较高的素质和责任心，并要求具备熟练的岗位技能，因此必须对从业人员进行岗位培训。培训方式可以送出去和请进来，培训后须经严格的考核，合格者持证上岗。^[33]

服务人员是体现铜官窑主体文化的重要载体，应该有针对性的对一线服务人员进行有针对性知识培训，让其尽可能了解文化遗产是见证了中华文明的发展，承载着几千年文明信息，代表了中华民族传统文化的丰富内涵和发展的历史轨迹。提高长沙铜官窑国家考古遗址公园吸引力，保护好、开发利用好文化遗产，对于传播文明、激发民族自豪感和爱国情怀具有不可替代的价值。^[34]

4.5 项目实施进度及招标方案

4.5.1 项目实施进度计划

1. 实施原则与步骤

(1) 项目实施应符合国家基本建设项目的审批程序;

(2) 建立专门机构作为项目执行单位,负责项目实施、组织、协调和管理工作;

(3) 项目实施单位委派专人担任项目法人,实施过程中的决策、指挥均由法人负责; [35]

(4) 项目设计、供货、施工安装等单位与项目实施单位履行必要的法律手续,并严格按照国家有关法律法规执行;

(5) 对工程质量负主要责任的领导和直接责任人,实行工程质量终身追究制度;

(6) 实行工程监理制,聘请有资格的监理单位和人员,对项目建设进行监理,抓好工程进度,提高工程质量,以降低成本;

(7) 严格按照基本建设程序办事,建设过程中,接受计划、审计等部门和社会舆论的监督,建成后按照有关规定进行严格的竣工验收;

(8) 严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用。 [33]

2. 建设进度

根据长沙铜官窑国家考古遗址公园建设工程的实际情况,本项目拟定建设期为3年。根据建设期安排,对各项基础设施建设进度安排如下:

(1) 2010年4月~2010年6月完成建设项目可行性研究报告的编制;

(2) 2010年6月~2010年9月完成初步设计及报批;

(3) 2010年9月~2010年12月完成施工图设计、项目招标;

(4) 2011年1月~2012年12月完成土建施工、安装调试;

(5) 2013年1月~2013年4月完成各项设施竣工验收。

工程实施进度计划见表4-5。

表 4-5 工程实施进度计划表

序号	阶段	进度 名称	第一年				第二年				第三年				第四年			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	前期 工作	可研报告编制																
2		初步设计文件编制、审批																
3	建设 期	施工图设计、拆迁、施工准备																
4		土建施工及安装																
7		竣工验收																

4.5.2 工程招投标方案

1. 编制依据

- (1) 《中华人民共和国招标投标法》;
- (2) 《工程建设项目施工招标投标办法》，【国家计委令第 30 号】;
- (3) 《关于进一步贯彻〈中华人民共和国招标投标法〉的通知》，【计政策（2001）1400 号】;
- (4) 《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》，【国家计委令第 96 号】。

2. 招投标管理

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定，以及湘计招【2002】636 号文，本项目属市政项目，投资额在 3000 万元以上，为关系社会公共利益、公众安全的基础设施建设项目，对项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料采购活动拟采用招标方式，招标活动拟委托具有相应资质的招标机构代理，招标代理机构依据建设项目招投标活动的有关法规开展公开招标活动，有关招标活动内容详见招标基本情况表及审批部门核准意见表，表 4-6、表 4-7。招标活动邀请招标办、纪委、监察等有关部门监督指导。

表 4-6 长沙铜官窑国家考古遗址公园建设工程招标安排

内 容	招 标 范 围		招 标 组 织 形 式		招 标 方 式		不采 用 招 标 方 式	投资估 算金额 (万元)	备注
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标			
勘 察		√		√		√			
设 计		√		√		√			
建筑 工程		√		√	√				
安装 工程		√		√	√				
监 理		√		√	√				
设 备		√		√	√				
重要 材料		√		√	√				
其 他									
情况说明:									

注：情况说明在表内填写不下，可附另页。

表 4-7 长沙铜官窑国家考古遗址公园建设工程审批部门审核意见

内 容	招 标 范 围		招 标 组 织 形 式		招 标 方 式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘 察		√		√		√	
设 计		√		√		√	
建筑 工程		√		√	√		
安装 工程		√		√	√		
监 理		√		√	√		
设 备		√		√	√		
重要 材料		√		√	√		
其 他							
审批部门核准意见说明：							
审批部门盖章 年 月 日							

注：审批部门在空格注明“核准”或“不予核准”

第 5 章 投资估算及资金筹措

5.1 投资估算

5.1.1 投资估算依据

本项目投资估算的依据主要有以下几个方面：

- （1）专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法及其他有关计算工程造价的文件。
- （2）专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数。
- （3）项目建筑工程费系按长沙市现行建筑造价扩大指标进行估算。
- （4）拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。^[36]

5.1.2 项目投资估算

整个项目投资为 39071.35 万元，其中：工程建设费 32034.40 万元，工程建设其他费用 2405.01 万元，不可预见费用 3443.94 万元，建设期利息 1188.00 万元，详见表 5-1。

表 5-1 长沙铜官窑国家考古遗址公园项目投资估算表 单位：万元

序号	建设内容	工程量	投资	备注
一	工程建设费用		32034.40	
1	考古调查、发掘	4800m ²	800.00	
2	遗址本体保护	3 处	2200.00	
3	遗址展示工程		2000.00	
3.1	遗址大标示点保护棚	7 条大龙窑、2 个挖泥洞	1800.00	
3.2	遗址小标示点保护棚	其他 30 多条龙窑等	500.00	
4	安全监控设施（设备购置）		1200.00	
5	围护围栏	5000m	100.00	
6	栈道架设	2000m ²	60.00	
7	重建宝塔	1 座	800.00	
8	服务中心及管理用房	2000m ²	300.00	
9	环保厕所（4 个）	400m ²	80.00	
10	标示、标牌等	500	50.00	

11	垃圾筒及垃圾收集站	200 个垃圾筒 及 2 座垃圾收 集站	30.00	
12	给排水		1000.00	
13	电气		900.00	
14	道路	72060m ²	2882.40	
15	停车场	3600m ²	72.00	
16	环境整治工程		17660.00	
16.1	彩陶溪疏浚工程	4800m	1200.00	
16.2	泥水港口一级提水机台	1 座	150.00	
16.3	觉华山二级提水机台改造及其引水渠 清淤	5000m	200.00	
16.4	觉华山至南村塘抗旱明渠硬化	5000m	1800.00	
16.5	吴家山塘清淤	28 亩	150.00	
16.6	钢筋桥拦河坝坝桥结合工程	麻石仿古桥	480.00	30X6m
16.7	古城大桥至黄土潭河坝段	1500m	200.00	
16.8	居民拆迁、安置等	70 户 264 人	11480.00	
16.9	民居改造	130 栋	1500.00	
16.10	污水处理	2 座	500.00	
17	动植物保护与绿化	2km ²	1000.00	
18	空调通风系统		400.00	
19	消防系统		500.00	
二	工程建设其他费用		2405.01	
1	建设单位管理费		480.52	
2	工程建设监理费		384.41	
3	勘察设计费		979.48	
4	办公与生产家具购置费		480.52	
5	工程招标、评标费		80.09	
6	环境影响评价费		48.05	
三	不可预见费用		3443.94	
四	建设期利息		1188.00	
五	建设投资		39071.35	
六	铺底流动资金		210.00	
七	总投资		39281.35	

5.1.3 铺底流动资金

参照同类项目现行流动资金投放、周转状况，经估算，项目正常生产年份需投放流动资金 700.00 万元。其中：铺底流动资金（按 30%计）为 210.0 万元。

5.1.4 项目总投资与投入总资金

项目总投资为 39281.35 万元，其中：建设投资 39071.35 万元，铺底流动资金 210.0 万元。若按投入流动资金总额计算，项目建设需总资金 39281.35 万元。

5.2 资金筹措

5.2.1 资金筹措方式

建设项目总投资 39281.35 万元，主要通过企业自筹、地方政府配套资金和银行贷款三种方式筹集建设资金，拟定资金来源如下：

- (1) 企业自筹资金 9281.35 万元；
- (2) 中央投资资金 10000 万元；
- (3) 地方政府配套资金 10000 万元；
- (4) 申请银行贷款 10000 万元，用于项目建设投资。

项目资金筹措及分年资金投入计划，详见表 5-2

表 5-2 资金筹措与使用计划表（单位：万元）

序号	项 目	合计	建设期			4
			1	2	3	
1	总投资	39281.35	16341.33	11365.01	11365.01	210.00
1.1	建设投资	39071.35	16341.33	11365.01	11365.01	
1.2	铺底流动资金	210.00				210.00
2	资金筹措	39281.35	16341.33	11365.01	11365.01	210.00
2.1	自有资金	19281.35	7153.33	4553.01	7365.01	210.00
	其中：用于流动资金	210.00				210.00
2.2	长沙市及县财政资金	10000.00	3000.00	3000.00	4000.00	
2.3	申请银行贷款	10000.00	5000.00	5000.00		

5.2.2 自筹资金来源分析

根据 2010 年 1 月，中共望城县委提出《关于支持解决长沙铜官窑国家遗址公园开发建设储备用地指标的请示》（望字【2010】1 号）和望城县国土资源局

《2010 年度统征建设用地地块八可行性研究报告》及望城县人民政府关于同意《2010 年度统征建设用地地块八可行性研究报告》的批复（望政发【2010】57 号）：该宗储备土地选址位于望城县丁字镇中山村、石渚湖村，总面积 983.14 亩，其开发条件优越，符合《望城县丁字镇总体规划》和《望城县丁字镇土地利用总体规划》；该宗储备土地拟作为长沙铜官窑国家考古遗址公园建设工程融资用地，经积极开展土地整理，盘活用地指标，聚集建设资金用于解决长沙铜官窑国家考古遗址公园建设工程的拆迁及保护等自筹资金。

根据目前丁字镇该宗地周边土地的出让情况，本可研暂按 38 万元/亩进行出让融资，接合生地变熟地的所有成本，现土地出让所得差价暂拟为 20 万元/亩考虑，则融资金额达到 19662.8 万元（具体待评估公司确定），能满足本项目建设自筹资金的需要。

第6章 效益评价及风险分析

6.1 财务效益评价

6.1.1 财务评价依据

本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目经济咨询评估指南》(中国国际工程咨询公司编著)及现行的财税制度编制。项目的建设是保护文化遗产,传承文明的需要,这将使铜官窑遗址的文化旅游价值得到较为充分的挖掘,为当地带来新的经济增长机会,为当地农民带来新的就业机会。因此,项目建设具有很大的经济社会价值。

该项目为社会公益性建设项目,重在社会效益。财务评价按公益建设项目的要求,只测算项目的年维护和运行费用。

6.1.2 财务评价的结论

1. 项目运行、维护费用估算

依本项目建设的具体内容和规模,本次研究对项目建成后所需运行、维护费用作如下测算。

(1) 人员支出:定员按180人估算,人均月工资1500元,并按工资总额的14%提取职工福利基金。年工资及附加总额为324万元。社会保障缴费51.71万元。

(2) 修理、维护费。本项目建设完成后,将形成需维护、修理的资产总额约为39071.35万元,参考省内同类设施的运行经验,项目资产日常维护、修理费率按1%估算,修理、维护费为390.71万元。

(3) 水、电消耗。根据公用专业提供的水电消耗数量,估算项目运行年水电消耗费用为147.93万元。

(4) 其他支出

主要包括:劳动保护费、办公费、差旅费、印刷费、保险费、工会经费、职工培训费、招待费等,暂估列105万元。

项目建成后年运行、维护费用支出总计1064.71万元,详见表6-1。

表 6-1 项目运行费用估算表（单位：万元）

序号	项 目	费率或单价	数 量	备 注
1	工资及福利费		369.36	定员按 180 人估算
1.1	工资（人/月）	1500	324	
1.2	福利费	14%	45.36	
2	上缴社会保障费		51.71	
3	日常维护、修理费	1%	390.71	资产原值 39071.35 万元
4	水电费		147.93	
5	办公、印刷		105	
6	合计		1064.71	

从上表可以看出，本项目投入运行正常年经营成本达 1064.71 万元，方可维持正常运行。

2. 运行维护费用来源

本项目收入来源主要是门票收入，本项目年接待游客 41.3 万人次，按 26 元/人次收取门票，年门票费用为 1073.8 万元。

3. 财务评价结论及建议

该项目的建设不是以盈利为主要目的，更主要的是强调对文化遗产的保护以及其产生的社会效益，因此只要把门票单价定为 26 元/人次，不需要财政拨款，靠门票收入就能维护项目的运行。

6.2 社会效益评价

6.2.1 国民经济的带动效益

现代旅游产业是创意性很强的综合产业，它集合现代的休闲性、体验性、参与性、娱乐性等理念于一体。^[37]旅游项目具有产业链长、产业关联度高、劳动密集度大、经济带动力强的特点，其涉及的核心产业包括吃、住、行、游、购、娱六大产业，此外，还涉及到通讯、保险、电力、环保、供水、社会服务等其它产业，因此，铜官窑项目在具有很强的经济带动功能，能够极大地改善周边交通运输条件，带动食品业、房地产业、娱乐业等地区商贸的发展。如图 6-1 所示：

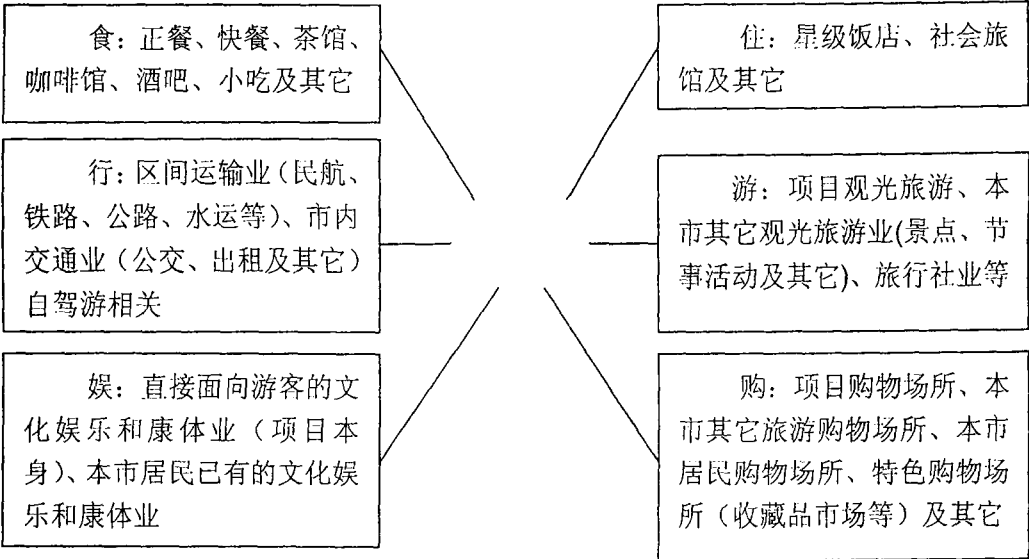


图 6-1 与项目直接关联的六类产业

依据上述分析，本项目在成熟期的可能游客规模区间为 41.3 万人次。分别计算国民经济相关数据。由于旅游产业对国民经济既有直接效果（直接最终需求引进），又有间接诱发性效果（由旅游需求诱发其它关联部分的生产再扩大），测算时先计算直接产出效果，再计算间接产出效果。

(1) 国民经济总产出

国民经济总产出反映在一定时期内生产的货物和服务的价值总和，以销售收入为基础，通过调整库存得出本期生产总成果。^[38]对于本项目而言，对国民经济直接总产出为全部游客带来的总收入。

2009 年，全国国内旅游出游人均花费 521.26 元（比上年增长 8%），若以此数据为参考值（暂不考虑时间因素），则项目全部游客所花费的金额年均值为 21528.04 万元，2008 年，湖南省接待入境旅游者达到 111.02 万人次，旅游创汇 6.17 亿美元，接待国内旅游者 12718.95 人次，实现国内旅游收入 808.84 亿元人民币，实现旅游总收入 851.75 亿元人民币，相当于全省 GDP 的 7.63%。但是，需要注意的是，从湖南省角度考虑，由于部分游客来源于外地，且游客旅游景区（点）在 1 个以上，其出游人均花费在很大一部分在外地产生，因此，用该值进行估算偏大，需要对游客进行结构性估算。这里，依据上述预测方案第一案的外地游客比例值（70%）进行结构性估算，即本地游客规模为 12.39 万人次，外地游客规模为 28.91 万人次。

假设：本地游客均为一日游，其支出包括门票、其它游乐支出、购物、交通、通讯费用、食物等，人均费用约为 220 元。外地游客中的在本项目消费为一日游，其在本项目支出包括门票、其它游乐支出、购物、交通、通讯费用、

餐饮（一餐）等，人均费用约为 350 元，由此计算的全部游客所花费的金额年均值为 1.28 亿元，为 2008 年湖南省旅游总收入（851.75 亿元）的 0.15%。

再考虑到项目建设期和运作期，以 2004-2008 年全国国内旅游出游人均花费增长率 2.2% 计算，至成熟期（约为 2012 后），项目为湖南带来的国民经济总收入为 1.37 亿元。

（2）国民经济总产出（间接）

为旅游者直接提供服务的经济部门需要相关行业的货品或服务的投入，旅游原生消费引起的直接旅游经济部门产出的扩大，将继续引起相关部门生产的再扩大，并可通过产业间的经济技术关联，将这一效应传递扩散到经济系统中的每一个角落，由此带来的使整个经济产出水平的提高。在我国现行统计制度下，旅游产业间接效应的计算可采用投入产出法，其计算方法是：

假设产业间的经济技术关联关系既定， $C = (C_1, C_2, \dots, C_n)$ T 为上期旅游消费需求的构成向量，则上期旅游对各产业产出的诱发额是： $W = B \cdot C$ ， B 为完全消耗矩阵。^[39]但由于该产出中包含中间使用部分的价值，因此应给予扣除，这种扣除通过产业的附加价值率计算，计算方法为：某产业的旅游诱发产出增加值 = 对应产业增加的价值量 $\times$ 产业的附加价值率。^[40]

以 2002 年我国投入产出表中各产业的附加价值率和国民经济各部门间的完全消耗系数为依据，本报告计算出的旅游产业产值乘数为 2.085，即我国每 1 元人民币的旅游收入，可为整个国民经济带来 2.085 元的产值（世界旅游理事会 WTTC 对全球旅游收入对国民经济总产出的乘数估算值为 2.5）。

本报告所测算的主要数据为：在成熟期的可能游客规模区间为 41.3 万人次。项目在成熟期每年所带来的国民经济总产出 3.41 亿元，其中直接产出 1.37 亿元，间接产出 2.04 亿元。直接产出在望城县本地产生，间接产出并不一定在本地产生。以 2006 年数据计算的新增本地就业机会 384 个。上述成熟期是指项目建成后运作第三年起的阶段。以此为依据，项目在成熟期每年所带来的国民经济总产出 3.41 亿元，其中直接产出 1.37 亿元，间接产出 2.04 亿元。但是，需要注意的是，由于区域间消费的转移和产业关联，间接产出并不一定都在本地产生。

6.2.2 对当地居民收入的影响

本项目实施后，对所在地居民收入的影响主要反映在两个方面，一是项目在建设过程中需要雇佣当地大量的劳动力，将产生收入效应，其收入规模通过劳动力成本体现出来。二是项目运营后，将大大提高铜官窑遗址保护水平、文物展示水平、服务设施和基础设施条件，吸引游客前来观光休闲，为当地带来更多的门票收入和旅游收入，并促进餐饮、住宿、交通、商业等相关产业发展，带来更大的收入效应。^[41]据本报告利用 2002 年我国投入产出表中各产业的附加

价值率和国民经济各部门间的完全消耗系数为依据的计算,旅游产业产值乘数为 2.085,即我国每 1 元人民币的旅游收入,可为整个国民经济带来 2.085 元的产值(世界旅游理事会 WTTC 对全球旅游收入对国民经济总产出的乘数估算值为 2.5)。可见,项目对经济发展的间接带动作用远大于本身产生的直接经济效益,因此,项目对所在地居民收入的影响是非常积极的。

6.2.3 对就业的影响

项目对居民就业的影响体现在两个方面,一个是项目对当地居民就业带动,项目的建设的就业效应主要体现在项目建设过程中带来的临时性就业岗位的增加。更重要的是,项目建设后带来的增加部分的游客量所需边际服务量远超过现有景区的服务边际供给量,项目建设能为所在地居民创造大量的新的就业岗位。依据 2002 年全国投入产出表,旅游业劳动密集程度排第 3 位,仅低于第一产业和批发、零售贸易业。^[42]有研究表明,1999-2004 年东部地区旅游业就业弹性为 0.19,中西部为 0.41。可见,旅游业对当地居民就业的影响是积极的。

另一方面是对周边地区就业的影响,依据 2002 年全国投入产出表,旅游业的资本装备系数为 3.99,劳动密集程度排第 3 位,仅仅低于第一产业和批发、零售贸易业。旅游业的完全资本装备系数是 3.11,劳动密集程度排第 4 位,住宿餐饮业排第 3 位,说明我国旅游业是劳动密集型行业。

张小利(2006)^[43]研究表明,1999-2004 年东部地区旅游业就业弹性为 0.19,西部为 0.41。唐代剑,李莉(2007)^[44]对浙江旅游业就业弹性系数计算值为 0.5。按照湖南省国民经济和社会发展“十一五”规划(以下简称湖南省“十一五”规划)及湖南小康社会总体构想的要求,2010 年三次产业占国内生产总值的比重将调整为 14:44.5:41.5,按照各产业从业人员变化趋势和年人均生产总值增长率预测,到 2010 年,湖南省一、二、三产业从业人员分别将达到 1700 万人、1050 万人、1550 万人,湖南省旅游收入在全国居十一位水平,本项目在成熟期所带来的直接收入可以为全市旅游总收入带来 1.83%的增长率,依 0.4 的就业弹性系数计算,则本项目可带来 809 个就业机会。^[45]当然,由于已有旅游业就业人数可能加入这一就业机会的竞争中,则实际的就业人数要小于该值。不过,有经验表明,一个年接待 10 万人次的乡村旅游景点,可直接和间接安置 300 位农民从业,这一经验数据与本研究相符合。

6.2.4 对相关利益群体的影响

在本项目中,政府和社会所付出的经济成本包括项目用地的机会成本、政府拆迁费用和基础设施配套费用等。依据项目的可行性研究报告提供的数据,约为 11480 万元。对当地政府(长沙市人民政府、望城县人民政府和丁字镇人民政府)而言,项目建成后,将大大改善项目所在地的基础设施条件,改善原住

民居住条件和生活环境,其对所在地基础设施和公共服务的影响是有利的。不过,在短期内,将由于本项目的开工建设而带来道路拥挤等现象。因此带动望城城市化建设;同时,可以为地方政府带来可观的财政收入,采用国际上和我国通用的税费统计法,财政贡献分为营业税和所得税两大部分,营业税以3%的营业税率统计(综合考虑统计中的重复环节和相关因素,只以3%营业税率计),企业所得税税前利润率以25%计,所得税税率按新企业所得税法税率25%计。由此估算的直接财政贡献和间接财政贡献分别为407万元和610.4万元,总贡献为1017.4万元。

铜官窑项目也为施工建设单位、工程评估、遗址管理机构、审计和金融机构等相关单位带来即期的利润收入,上述不同利益群体中均为项目受益群体,尤其是当地政府、管理机构及周边居民对项目期望很高,认为项目实施能够极大地促进当地旅游业发展,为居民带来就业机会和收入,改善当地以农业为主的经济结构,并增加财政收入。因此,项目建设与各利益群体的利益是一致的。

6.2.5 对所在地文化教育卫生等方面的影响

文化旅游业是融旅游景点、设施、产品和丰富的文化内涵为一体的文化产业,是当今世界最具生命力的新兴产业。文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体,文化旅游产业既是精神产品,又是发展国民经济软实力的重要元素。^[46]铜官窑遗址是中华文明史历史见证的文化遗产,是几千年文明史的重要载体,它们集中代表了中华民族传统文化的丰富内涵和发展的历史轨迹,通过建设遗址公园,既保留了优秀传统文化,也有利于对千年古窑文化的传播,因此对当地文化教育事业有积极的影响。

铜官窑项目建设内容为遗址区文物本体保护工程、生态保护及园林绿化工程、考古遗址公园、考古过程展示工程、现存遗址展示工程、旅游景点及道路交通网络、水利水系改造工程、核心区民居改造与利用工程等,整个项目的规划合理科学、管理严格,项目建设对当地卫生环境和卫生观念等都具有积极的影响。

6.2.6 项目与社会的互适性分析

(1) 项目与国家 and 地方发展战略的互适性分析

项目为遗址保护项目和文化休闲旅游产业项目,其定位符合国家和地方发展战略。中国历来重视遗址的保护工作,近代的文物古迹保护的观念和方法开始于20世纪30年代,在专业建筑师的主持下,整修了一批古建筑。50年代至90年代,保护、整修的项目大量增加,积累了丰富的经验,并先后制定了《中华人民共和国文物保护法》、《中国文物古迹保护准则》等重要文件和技术规范。

长沙铜官窑遗址保护也得到了国家和地方的重视。1988年1月,被国务院

公布为全国重点文物保护单位,2006年被列入“十·五”全国100个重点大遗址保护项目。2010年2月2日,国家文物局下发《关于铜官窑考古遗址公园概念性规划的批复》。《批复》原则同意长沙铜官窑遗址保护规划,要求湖南省文物局组织规划编制单位联合专业考古研究单位,根据《批复》中所提出意见,对规划做进一步修改和完善后,报请湖南省人民政府批准公布,并督促地方人民政府将其纳入当地经济和社会发展规划以及城乡总体规划,积极组织有关部门逐步实施,同时要求对规划中提出的各类文物保护和展示以及环境整治、相关基础设施等项目,应制定具体方案并按程序报批。本项目建设正是落实国家《批复》精神的具体措施,与国家和地方的遗址保护战略是一致的。

同时,作为一个具有文化旅游价值的项目,项目建设与国家和地方发展旅游业的战略也是一致的。2009年12月,国务院下发《关于加快发展旅游业的意见》,提出加快旅游业的发展。2007年,湖南省委省政府下发《关于加快发展旅游产业的决定》,提出将“旅游业作为经济发展的支柱产业”、实现从“从旅游资源大省向旅游产业大省跨越”的发展战略。按照《长沙市旅游业总体规划》(2007-2020年),长沙市未来要建成为湖南省旅游中心城市,长沙铜官窑国家考古遗址公园即是其中重要的景区。根据望城县旅游发展目标,长沙铜官窑国家考古遗址公园也是发展重点。同时,湖南省委省政府也把文化强省作为发展战略,并把文化遗产视为经济社会发展的积极力量。在此背景下,文化遗产的保护得到前所未有的重视。区位优势明显、文化价值独特的长沙铜官窑遗址受到了各方的高度关注。目前,长沙市成立了以省委常委、市委书记为组长的保护利用协调工作领导小组,有力地推动了遗址保护建设的进程。

(2) 项目与当地文化技术的互适性

项目由于对当地居民就业、收入、基础设施条件、原住民生活环境的促进作用而受到当地群众的接受,项目无特殊的文化要求和技术要求,与当地文化技术能够相互适应和协调发展。^[47]

(3) 项目承担机构能力的适应性

项目承担机构有较丰富的项目建设管理经验。但由于本项目专业性较强,在建设过程中容易造成文物损毁,或者对工作人员和原住民的人身安全造成负面影响,需要承担机构加强能力建设,制定周密可行的实施方案和应急方案。

(4) 项目对公平的影响

项目所在地丁字镇以农业人口为主,经济社会发展基础和条件相对较差,居民收入水平相对较低。通过本项目的实施,将极大地增强遗址的展示功能、旅游功能、服务功能,提高其可观赏性和休闲性,使遗址的经济社会功能得到较为充分的发挥,从而促进当地旅游业及相关产业的发展。同时,项目建设将

为当地带来较完善的基础设施系统,为当地经济社会发展提供基础条件,这对促进欠发达地区的经济社会发展,缩小我国地区间差异是非常有益的。可见,项目对社会公平具有积极的促进作用。^[48]

6.3 风险分析

6.3.1 项目风险因素识别

本项目存在的主要风险因素包括:

(1) 文物安全风险。指在项目建设和文物展示过程中,由于施工、技术、管理、自然力、人为等因素引起的对文物造成损害、破坏、遗失等风险。

(2) 市场风险。主要指因经济不景气带来旅游市场需求下降,或因同类竞争项目竞争使得项目游客规模不能达到预期目标,难以实现旅游收入目标和利润而导致的风险。

(3) 技术风险。主要指建设过程中工程技术不先进、技术采用不合理引起的项目建设工程问题、生产安全问题等造成的损失。

(4) 工程风险。主要指建设中工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化,导致工程量增加、投资增加、工期拖长、生产事故等所造成的损失。^[49]

(5) 资金风险。主要指资金来源中断或供应不足,导致融资成本提高,工期延长,给建设和生产运营造成的财务损失。

(6) 建设协作风险。主要指投资项目所需要的原材料供给、给排水、供电供气、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化,给建设和生产运营带来困难。

(7) 社会风险。由于建设投资和项目运营对社会和原住民产生的不良影响而带来的社会冲突等。^[50]

6.3.2 项目风险评估

风险评估采用专家评估法。主要因素的风险水平评估如下:

(1) 文物安全风险

针对遗址本体的项目建设对文物可能造成较大的破坏;文物展示也可能导致文物破坏和遗失。最好的保护方法是不发掘、不开发利用,但这样又使文物失去研究意义、教育意义和经济意义。因此,在发掘和开发利用过程中,文物的安全风险总是存在的。

(2) 市场风险

旅游业是新兴的朝阳产业。1994-2009年,国内旅游人数规模5.7亿人次上

升至 19.0 亿人次, 年均增长 8.36%, 市场发展非常迅速。^[51]尤其是, 近几年我国旅游业已进入一个高速成长期, 2002-2009 年间, 国内旅游人数规模年均增长远高于 1994-2007 年的增长水平。据联合国世界旅游组织统计, 2007 年中国旅游业在世界排名第四位, 旅游消费已超过旅游大国意大利, 排名第六位。并预测, 由于我国旅游业迅猛发展, 中产阶层增幅明显, 已形成一个强大的旅游消费群体, 有望成为世界第一大旅游目的地国家。因此, 从整个旅游市场看, 项目具有良好的市场需求环境。

从项目本身看, 项目旅游资源具有独特性和不可复制性。长沙铜官窑始创于唐代“安史之乱”后, 距今有 1000 多年的历史, 是与浙江越窑、河北邢窑齐名的中国唐代三大出口瓷窑之一。与同类瓷窑相比, 在技术上, 长沙铜官窑突破了当时青、白瓷的单一色调, 首创高温釉下多彩、铜红釉, 以民窑的技术力量推动了陶瓷工艺的发展; 在工艺上, 长沙铜官窑将模印贴花、雕刻、书法、绘画、融入陶瓷装饰艺术中; 在艺术题材上, 通过丰富多彩的图形、造型各异的花鸟走兽、人物场景、诗词谚语, 将浓浓的中华风情及异域文化融合在一件件器物上。因此, 铜官窑是一座蕴含了丰富的历史、科学、文化、艺术价值的古文化遗址, 在我国的文明发展史上具有独特的意义。这一人文景观所蕴含的文化价值是其它地方无法模仿和复制的, 在各地争相发展旅游业的竞争格局中, 本项目无疑有着独特的竞争力。同时, 项目地处湖南省核心经济区长株潭区域, 具有很好的人口支撑和经济支撑。市场分析表明, 本项目将很快向快速增长阶段过渡。可见, 项目具有良好的市场发展前景。市场风险较小。

(3) 技术风险

项目所需工程技术为成熟适用技术, 现有技术能够满足本项目的建设要求, 源于技术的风险程度较低。^[52]

(4) 工程风险

项目对地质条件无特殊的要求, 工程风险较低。但部分地域地质条件较为复杂, 将对施工带来影响。

(5) 资金风险

项目需要较大规模的资金。项目单位难以完成本项目的大投入。因此, 项目需要申请上级政府支持。项目建设可能因资金不到位难以进行或中断。

(6) 外部协作风险

项目所在地具有一定的基础设施条件, 各施工工具和材料能够运输到各景点。但由于部分景点内部道路设施不完善, 部分路段难以满足运输要求, 因此存在一定的外部协作风险。^[53]

(7) 社会风险

项目能够促进当地居民就业和收入水平的提高,并带动相关产业如餐饮、住宿、交通、商业等相关产业发展,还有增加财政收入等积极作用,对各利益群体的影响是积极的,社会风险低。但项目建设时可能对游客和周边居民的出行安全产生一定的影响,需要积极防范。

6.3.3 防范风险的对策

(1) 认真做好项目建设领导、规划、组织和管理工作

加强对项目建设工作的领导,认真落实领导责任。建立项目建设文物保护负责制和专家咨询制度。严格工程管理,落实文物保护工程队伍资质制度、项目责任制度和工程监管制度,严格执行文物保护技术规范,确保工程质量,确保文物安全。

(2) 加强针对遗址本体保护和文物展示项目技术研究和攻关,根据地质、气候、水文、资金等条件精心选择适宜技术。^[54]

(3) 提高文物保护和展示水平。高标准建设展示馆,实施文物信息化和保存环境达标建设,加大文物科技保护力度。加强对藏品的登记、建档和安全管理,落实藏品丢失、损毁追究责任制。加强专业人员培养,提高文物保护队伍素质。

(4) 制定遗址区旅游管理条例,对长沙铜官窑遗址区内的旅游设施种类、规模及游客容量要进行合理的控制与管理。

(5) 加强与省和国家相关部门联系沟通,争取中央政府和省级政府在融资上的支持,确保资金到位。^[55]

(6) 加强项目建设规划,尤其是加强复杂地质条件下的施工建设规划,制订突发事件应急预案。

(7) 加强施工组织和管理,对工程建设进行封闭式管理,引导游客和居民远离建设现场,材料运输尽量避开游客和其它车辆。

(8) 加强安全生产管理。自觉坚持“安全第一、预防为主”的方针,认真贯彻执行《安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规的有关规定。^[56]强化安全生产责任制,把安全生产工作任务层层分解,落实到建设单位各个基层单位、各生产环节和各个岗位,严格监督检查,确保建设安全。

结 论

文化遗产是中华文明史的历史见证，也是几千年文明史的重要载体。随着社会的变迁，尤其是当代工业化和城市化进程的加快，同世界上众多的古文化遗址一样，长沙铜官窑遗址正面临着被现代工业的快速发展破坏的威胁。因此在现有长沙铜官窑遗址基础上，将长沙铜官窑遗址区规划为集文物保护、教育、科研、旅游、休闲等多种功能于一体的“长沙铜官窑国家考古遗址公园”，既是保护文化遗产、传承文明的需要，又具有挖掘文化遗产经济社会价值及对大遗址保护、展示、研究和国际文化交流的重要意义。

本文重点从项目方案的制定、项目资金的来源及运用和项目的财务、社会效益和风险因素等几个方面对铜官窑项目的可行性进行了深入研究。可以发现，建设项目总投资为 39281.35 万元，正常年经营成本达 1064.71 万元，由于该项目的建设不是以盈利为主要目的，靠门票收入就能维护项目的运行。建设项目符合国家、省、市关于大力发展旅游文化事业的产业政策，符合“扩大内需、拉动国内有效社会总需求”。具有极大的生态效益与社会效益，并可带动景区和辐射区内的服务行业发展，为当地群众和企业下岗人员就业、创收开辟途径。项目建设主要对遗址进行保护以及开展有关环境整治工作，有利于保护环境，不会对周边环境造成污染。作为一个具有文化旅游价值的项目，项目建设与国家 and 地方发展旅游业的战略也是一致的，同时，湖南省委省政府也把文化强省作为发展战略，并把文化遗产视为经济社会发展的积极力量。在此背景下，文化遗产的保护得到前所未有的重视。区位优势明显、文化价值独特的长沙铜官窑遗址受到了社会各方的高度关注，项目建设是非常必要的。建议储备土地开发利用待各项手续到位后加紧实施，以保证自筹资金的到位。

参考文献

- [1] George Wu. Nonlinear decision weights in choice under uncertainty [M]. Management Science. 1999
- [2] Ardalan. Economic and Financial Analysis for Engineering and Project Management[M]. Technomic Pub. Co. 1998
- [3] Mason, Colin M. and Richard T. Harrison. Is Worth It The Rates of Return from Informal Venture Capital Investments[J]. Journal of Business Venturing, Vol. 17, 2002
- [4] Casamatta, Catherine. Financing and Advising: Optimal Financial Contracts with Venture Capitalist[J]. The Journal of Finance, Vol. 58 NO. 5, 2003
- [5] Shen, L. Y. Risk Management, In Building in value: Pre-design Issues[M]. Arnold Publishers, 1999
- [6] 投资项目可行性编写组. 投资项目可行性研究指南[M]. 北京: 中国电力出版社, 2002
- [7] 于守法. 投资项目可行性研究方法 with 案例应用手册[M]. 北京: 地震出版社, 2002
- [8] 王武龙. 投资项目经济咨询评估指南[M]. 北京: 中国经济出版社, 2000
- [9] 游达明. 技术经济与项目经济评价[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 2001
- [10] 赵国杰. 投资项目可行性研究[M]. 天津: 天津大学出版社, 2003
- [11] 吴瑶枢. 建设项目可行性研究报告编制析论[M]. 湖南科技学院学报, 2009 (9)
- [12] 梁爽. 房地产投资可行性分析中的成本及投资估算[M]. 中国经济出版社, 2003
- [13] 唐建. 可行性研究在项目建设中作用[J]. 中国高新技术企业, 2008 (7)
- [14] 邹坦, 郭春翔. 工程项目投资决策可行性研究的探讨[J]. 科技广场, 2008 (6)
- [15] 何全君. 论工程项目管理中的成本控制[J]. 广东建材, 2008 (3)
- [16] 蔡全法, 寇玉海. 长沙窑析议[J]. 东南文化, 2001 (5)
- [17] 秦莉萍. 文化遗产景观保护性开发建设——天心公园景观规划设计[J]. 大众文艺, 2009 (22)
- [18] 陈筱燕. 文化遗产保护与扬州瘦西湖新区旅游开发[J]. 艺术百家, 2007

(4)

[19] 刘德兵. 浅析我国古代考古遗址旅游开发原则 [J]. 农业考古, 2010(3)

[20] 白建云. 西北地区土建筑遗址的保护 [J]. 土工建筑, 2008(3)

[21] 林汉生. 从南炮台公园规划设计谈遗址景观的保护利用[J]. 山西建筑, 2010(2)

[22] 王赞. 土遗址加固保护概述[J]. 土工基础, 2009, 23(10): 5

[23] 王仙波. 试谈古遗址保护的六大问题及解决办法 [J]. 中国文物科学研究, 2010(1)

[24] 注册咨询工程师(投资)执业资格考试教材编写委员会. 工程项目组织与管理[M]. 北京: 中国计划出版社, 2003

[25] 裴强强. 土遗址加固保护工程资料应用与管理——新疆交河故城抢险加固工程[J]. 敦煌研究, 2008(3)

[26] 单霁翔. 让大遗址保护助推经济社会发展[J]. 中国文化遗产, 2009(4)

[27] 王丽萍. 建设前期可行性研究的作用[J]. 山西建筑, 2007, 33(2)

[28] 苏泊民. 国外遗址保护发展状况和趋势[J]. 中国文化遗产, 2005(1)

[29] 葛宝山, 邬文康. 工程项目评估[M]. 北京: 北京交通大学出版社, 2004.

8

[30] 于剑锋. 可行性研究在项目建设中的作用[J]. 中国科技信息, 2007(21)

[31] 王来福. 如何编制投资项目可行性研究报告[J]. 工程建设与设计, 2001.5

[32] 马小丁. 投资项目可行性研究的有益参考[J]. 中国投资, 2002.7

[33] 周惠珍. 投资项目评估案例分析[M]. 大连: 东北财经大学出版社, 2000

[34] 刘立群. 工程项目投资分析[M]. 化学工业出版社, 2005.9

[35] 国家发改委组织编写. 投资项目可行性研究指南[M]. 北京: 中国电力出版社, 2002

[36] 黄渝样. 林洁, 对投资项目财务评价(分析)的几点看法[J]. 技术经济, 2004(4)

[37] 袁尧. 成都水井坊历史街区保护规划思考[J]. 中国名城, 2010(9)

[38] 郭九成. 科研项目的可行性研究[J]. 中国科技论坛, 2007(11)

[39] 建设部标准定额研究所. 建设项目经济评价参数研究[M]. 北京: 中国计划出版社, 2004

[40] 任淮秀. 项目融资[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2004

[41] 姜根伍. 我国风险投资制度创新研究[J]. 经济研究参考, 2006(23)

- [42] 陈文立. 项目投资风险分析理论与方法[M]. 北京: 机械工业出版社, 2004
- [43] 张小利. 论我国旅游业和旅游高等教育[J]. 黄河科技大学学报, 2002 (3)
- [44] 唐代剑, 李莉. 对旅游就业弹性测量的实证研究——以浙江省为例[J]. 旅游科学, 2005 (2)
- [45] 莫力科、陆绍凯、陈世聪. 香港大型公共工程项目技术可行性声明及可行性研究分析[J]. 建筑经济, 2008 (10)
- [46] 贾丽娟. 基于投资项目进行可行性分析的研究[J]. 今日科苑, 2008 (6)
- [47] 王文隶. 项目投资的经济可行性分析[J]. 财经观察, 2008 (4)
- [48] 贺治强. 大型建设项目可行性研究中存在的问题及对策分析[J]. 煤炭经济研究, 2009 (8)
- [49] 周莉. 试论企业项目投资可行性分析[J]. 市场周刊, 2009 (7)
- [50] 张玲. 北京市开展清洁发展机制的可行性与对策分析——以八达岭碳汇项目为研究对象[J]. 经济研究导向, 2009 (7)
- [51] 杨华. 九寨沟风景区开拓澳洲市场的必要性和可行性分析[J]. 中国商界, 2010 (7)
- [52] 张祥敏. 泥河水库兰西城镇供水可行性分析[J]. 黑龙江水利科技, 2010 (5)
- [53] 沈党云. 高速公路作为云南主要旅游交通方式的可行性分析[J]. 公路交通科技, 2010 (8)
- [54] 薛楠. 企业投资项目可行性分析[J]. 现代商贸工业, 2010 (5)
- [55] 秦浩. 基于 SWOT 分析焦作市体育旅游开发的可行性研究[J]. 科技信息, 2010 (20)
- [56] 白淑萍. 我国铁路建设应用 BOT 融资的可行性分析[J]. 河北企业, 2010 (7)

致 谢

衷心感谢导师张颖教授对我的关心和指导，张老师认真严谨的治学态度、热忱宽厚的待人态度令我感动，使我时时自勉，不敢懈怠。张老师传授给我的知识和做人的道理，使我终生受益。

感谢中南大学商学院所有给我传授过知识的老师们，在我 MBA 的学习生涯中，您们给了我诸多的教诲和指导，使我受益匪浅。

感谢与我一起攻读 MBA 的同学们，在一起的学习和生活中，你们给了我许多的帮助，从你们身上我同样学到了很多可贵的东西。

在中南大学商学院学习的日子里，我不仅增添了专业的知识，更拥有了宝贵的友谊，我将永远铭刻这段珍贵的记忆。

骆志平

2011 年 5 月
